



Priebežná správa o činnosti č. 5 za tretí kvartál 2023, sekcia A

Sledované obdobie: 1.7.2023 – 30.9.2023

**Stavebný dozor na stavbe: „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica
ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa“
Sekcia A**

Zmluva o Dielo: ZOD/21012/001;

Zmluva na poskytnutie služby: IZ BUNG – INFRAM/ZSR/2022/001

Vypracoval:
Ing. Marek Fusko, MBA
stavebný dozor

Čadca, 12. október 2023

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Obsah

1.	Úvod.....	3
2.	Základné údaje stavby.....	4
3.	Stručný opis.....	5
4.	Plnenie Zmluvy o dielo na realizáciu stavby.....	6
5.	Plnenie Zmluvy.....	7
6.	Popis postupu stavebných prác.....	8
6.1	Prehľad vykonaných stavebných prác.....	9
6.2	Kontrola kvality.....	13
6.3	Geotechnický dozor.....	15
6.4	Autorizovaný geodet.....	17
6.5	Environmentálny expert.....	18
6.6	Kontrola BOZP a PO na stavbe.....	24
7.	Kontrola harmonogramu prác a výhľad na ďalšie obdobie (kritická cesta).....	25
8.	Grafické znázornenie finančného a fyzického plnenia ZoD, sekcia A.....	26
9.	Problémy na stavbe a ich riešenie.....	29
10.	Riziká a odporúčania stavebného dozoru.....	31
11.	Prehľad o vyzískanom materiáli a o jeho naložení.....	32
12.	Evidencia odpadov.....	36
13.	Tabuľka preberacích konaní, predčasných užívaní a kolaudačných rozhodnutí.....	39
14.	Dokumentácia, ktorú Poskytovateľ vedie počas jeho činnosti na stavbe.....	40
15.	Záznamy v stavebnom denníku.....	41
16.	Zoznam Oznámení Zhotoviteľa.....	42
17.	Zoznam Nárokov Zhotoviteľa.....	45
18.	Ponuky Zhotoviteľa.....	58
19.	Zoznam Pokynov SD.....	60
20.	Evidencia Podzhotoviteľov schválených SD.....	61
21.	Evidencia pracovných rokovaní.....	63
22.	Záver.....	64
23.	Fotografické prílohy.....	65

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

1. Úvod

Táto priebežná správa je spracovaná v súlade s podčlánkom 13.3 Priebežné správy o činnosti Zmluvy na poskytnutie služby č. IZ BUNG – INFRAM/ZSR/2022/001. Správa poskytuje údaje o začatí a vývoji činnosti poskytovateľa služby stavebného dozoru a aktuálnom stave na stavbe/stavenisku v sledovanom období. Smeruje na organizačné a technické stránky, ktoré majú byť kontrolované, vrátane predvídaných problémov s odporúčaním na ich riešenie.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

2. Základné údaje stavby

Názov stavby:	ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa Sekcia A
Objednávateľ:	Železnice Slovenskej Republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zhotoviteľ:	Združenie „ŽSR, KYSUCE“
Vedúci člen:	TSS GRADE, a. s. Dunajská 48 811 08 Bratislava
Člen:	VÁHOSTAV – SK, a. s. Priemyselná 6 821 09 Bratislava
Lehota výstavby:	do 25 mesiacov od odovzdania staveniska
Odovzdanie staveniska:	dňa 12.8.2022
Zmluva o dielo:	ZOD/21012/001
Dodatky k ZoD:	Dodatok č. 1 zo dňa 26.7.2023
Generálny projektant:	REMING Consult a.s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Stavebný dozor:	Inžinierske združenie BUNG-INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava
Zmluva na poskytnutie služby:	IZ BUNG – INFRAM/ZSR/2022/001

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

3. Stručný opis

Predmetom stavby je železničná trať, s cieľom jej modernizácie pre dosiahnutie požadovaných parametrov. Predmetný úsek modernizovanej železničnej trate úseku Čadca – št. hr. ČR/SR sa podľa územnosprávneho členenia Slovenskej republiky nachádza v Žilinskom kraji a prechádza okresom Čadca.

Požiadavka modernizácie železničných tratí ŽSR vychádza z koncepcie európskych dopravných koridorov definovaných na II. Paneurópskej konferencii ministrov dopravy konanej na Kréte v roku 1994. Nadväzovala na snahy Európskej únie o rozvoj novej železničnej politiky, ktorá vyjadruje aj integračné snahy o zjednotenie fungujúceho železničného systému, harmonizáciu kvalitatívnych ukazovateľov, zákonodarných opatrení a zvyšovanie výkonnosti železníc vo všetkých európskych štátoch aj mimo EU.

Hlavnými kritériami modernizácie železničnej infraštruktúry predmetného úseku trate je dosiahnutie parametrov vyplývajúcich z dohôd AGC a AGTC, predpisov a TSI; predovšetkým sa jedná o nasledovné parametre:

- zvýšenie traťovej rýchlosti,
- zvýšenie priestorovej priechodnosti,
- zvýšenie únosnosti železničného spodku,
- zvýšenie bezpečnosti prevádzky,
- zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania,
- zníženie negatívnych dopadov železničnej prevádzky na obyvateľstvo,
- zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Pozitíva stavby :

- rešpektovanie dlhodobého rozvoja železničných ciest,
- zvýšenie bezpečnosti odstránením úrovňových krížení,
- zavedenie interoperability,
- zvýšenie traťovej rýchlosti a skrátenie tým jazdného času,
- zníženie hladiny zvuku a vibrácií.

Negatíva stavby :

- negatíva stavby sa prejaví hlavne v čase realizácie,
- nové trvalé zábery územia pri preložkách trasy pre dodržanie rýchlosti,
- dočasné zábery územia,
- výrubu stromov v miestach preložiek trasy a umelých stavieb.

Projektová dokumentácia je z hľadiska postupu výstavby vypracovaná tak, že je možné modernizáciu uskutočniť pri zachovaní prevádzky železničnej dopravy a to postupným vylučovaním koľají a zachovaním aspoň jednej priebežnej koľaje v medzistaničných úsekoch.

Technické špecifikácie jednotlivých Stavebných objektov a prevádzkových súborov sú zrejmé z projektovej dokumentácie.

Realizácia Diela je rozdelená do dvoch Sekcií nasledovne:

Sekcia A: Čadca – Svrčinovec

Sekcia B: Svrčinovec (mimo) – štátna hranica ČR/SR

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

4. Plnenie Zmluvy o dielo na realizáciu stavby

Plnenie Zmluvy o Dielo číslo ZOD/21012/001 zo strany Zhotoviteľa bolo zabezpečované predovšetkým realizáciou stavebných prác na stavbe ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa, Sekcia A.

Zhotoviteľ v zmysle ZoD informuje o postupe stavebných prác prostredníctvom správ, vydávaných v tomto rozsahu:

- Týždenné správy č. 27 – 39 / 2023
- Mesačné správy za júl, august, september 2023

Týždenné aj mesačné správy sú zasielané príslušným zložkám ŽSR ako i SD.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

5. Plnenie Zmluvy

Stavebný dozor „Inžinierske združenie BUNG - INFRAM“, v zastúpení vedúcim členom združenia spoločnosťou BUNG Slovensko s.r.o, Ružová dolina 6, 821 056 Bratislava 2 sa vykonáva v súlade so Zmluvou na poskytnutie služby č. IZ BUNG-INFRAM/ZSR/2022/001, ktorej účinnosť bola nadobudnutá jej zverejnením dňa 30.8.2022. Služba stavebného dozoru sa poskytuje odo dňa odovzdania staveniska, t. j. odo dňa 12.8.2022.

Medzi hlavné oblasti poskytovanej služby SD patrí predovšetkým:

- Kontrola vedenia a evidencie stavebných denníkov
- Preberanie prác pred zakrytím
- Účasť na kontrolných meraniach terénu
- Kontrola kvality prevedených prác, dokumentácie o kvalite stavby
- Kontrola a zabezpečovanie dodržiavania podmienok stavebných povolení, ROV, HMG, POV, platných STN a VTPKS
- Kontrola množstiev, druhu a kvality vykonaných prác, ich súlad s PD
- Kontrola vecnej správnosti súpisov vykonaných prác Zhotoviteľa, ich súlad s oceneným výkazom výmer, kontrola fakturácie Zhotoviteľa
- Spolupráca s autorským dozorom, kontrola a dopĺňanie PD
- Príprava podkladov k zmenovým konaniam a zmenovým listom
- Kontrola správnosti opodstatnenia vykonania naviac prác
- Operatívne kontroly stavby
- Sledovanie dohodnutých termínov
- Zabezpečovanie ohlásenia archeologických nálezov
- Spracovanie požadovaných správ
- Zabezpečovanie TP, preberacích konaní, predčasných užívaní a kolaudácií stavby
- Príprava podkladov k zaradeniu stavby do DHM
- Príprava podkladov na zápis zmien do katastra nehnuteľností
- Kontrola a evidencia dokladov, ktoré Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v priebehu výstavby
- nezávislé a spravodlivé rozhodovanie v sporných otázkach

Podrobný predmet, obsah, rozsah a podmienky poskytovania služby sú uvedené v ustanoveniach zmluvy na poskytnutie služby č. IZ BUNG-INFRAM/ZSR/2022/001 uzavretej medzi objednávateľom ŽSR a poskytovateľom služby SD.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

6. Popis postupu stavebných prác

Stavba „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3.etapa“ uskutočňovaná Zhotoviteľom stavby v zmysle ZoD, projektovej dokumentácie a stavebných povolení. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 12.8.2022 na pôde ŽSR OR Žilina za účasti zástupcu Objednávateľa, budúceho správcu, riadiaceho orgánu, autorského dozoru zhotoviteľa i externého stavebného dozoru, ktorý od tohto dátumu poskytuje službu SD v rozsahu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy na poskytnutie služby.

K dátumu spracovania kvartálnej správy Zhotoviteľ vykonal v **Sekcii A** nasledovné práce:

Realizácia prác v 2. etape:

Aktuálne prebieha výluka koľaje č. 1 v súlade s ROV č. 465 – realizácia 2. etapy.

V sledovanom období sa vo výlučenej koľaji uskutočnili nasledovné stavebné práce a práce nadväzujúce na činnosti zrealizované v 0. etape a v 1. etape:

- úprava TV, demontáž TV, TP, základov TP, realizácia nových základov TP
- ochrana a preložka súkromných vodovodov
- zárubné múry – realizácia špeciálneho zakladania na SO 08-33-10, realizuje sa úprava hláv VPP, budovanie rímsových častí, zemné práce na SO 08-33-12
- dovoz a vykládka betónových podvalov, realizáciu vrstiev žel. spodku, výkop a realizácia spevnených priekop
- demontáž nástupišťa na zastávke Svrčinovec
- odťazenie a odvoz navážok pri SO 08-33-06, realizácia zabezpečenia svahu a stavebných jám zo štetovnic a lanových kotiev pre piliere a oporu č. 1, prípravné práce na realizáciu špeciálneho zakladania základov OP1
- geodetický monitoring
- preložka inžinierskych sietí (T-com, vodovody)
- úprava zab. zar. a zabezpečenie stavebných postupov
- pokusné zarážanie štetovnic na SO 08-33-01, 08-33-03, 08-32-52
- realizácia priepustov
- prípravné práce a realizácia štetovnic na žel. mostoch

Vzhľadom na rozsah doposiaľ vykonaných prác stavebný dozor dôrazne odporúča Zhotoviteľovi zvýšenie pracovných kapacít a účelnejšie využívanie odsúhlasených výluk.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

6.1 Prehľad vykonaných stavebných prác

V sledovanom období Zhotoviteľ v sekcii A vykonával nasledovné činnosti:

PS 08-21-02.1A		Čadca štátna hranica ČR/SR, zabezpečenie stavebných postupov SP1, Sekcia A Čadca - Svrčinovec
Opis priebehu prác:	07 - 09/2023	Demontáže svetelných návestidiel, stykových transformátorov, prepojovacích lán stykových transformátorov. Demontovaný materiál uložený v priestoroch Zhotoviteľa Pripravený na opätovnú montáž v ďalších stavebných postupoch.
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV kvartál :	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

SO 08-32-02.A		Čadca - štátna hranica ČR/SR, železničný spodok
Opis priebehu prác:	07-09/2023	Odkop zeminy na úroveň zemnej pláne, pokládka geosyntetik, navážanie, rovnanie a hutnenie konštrukčnej vrstvy zo ŠD fr. 32-63 mm, zriaďovanie spevnených priekop.
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV kvartál :	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

SO 08-32-03.A		Čadca - štátna hranica ČR/SR, železničný zvršok - demontáž
Opis priebehu prác:	07-09/2023	Demontáž koľajových polí z koľ. č. 1 v úseku sžkm 281,598 - sžkm 283,000 a sžkm 283,600 – sžkm 284,300. Demontáž nástupišťa pri koľ. č. 1. Odkop a odvoz štrkového lôžka na recyklačnú plochu.
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV kvartál :	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

SO 08-32-51, 52, 53		Čadca - štátna hranica ČR/SR, priepusty
Opis priebehu prác:	08-09/2023	Zarážanie štetovnic, odkopy a rozbíjanie konštrukcií stávajúcich priepustov, zriadenie úložných betónových prahov, pokládka prefabrikátov a zriadenie izolačných náterov.
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV kvartál :	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

SO 08-35-01 A		Čadca štátna hranica ČR/SR, trakčné vedenie
Opis priebehu prác:	07 - 09/2023	zriadenie základových pätiiek z betónu, montáž stožiarov TV, montáž konzol, montáž lán, montáž trakčných vodičov, demontáže jestvujúcich základov TV, stožiarov, vodičov a lán TV
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV. kvartál	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

SO 08-35-02 A		Čadca štátna hranica ČR/SR, ukoľajnenie ocelových konštrukcií
Opis priebehu prác:	07 - 09/2023	zriadenie ukoľajnenia s prierazkou, montáž lana FeZn, demontáže jestvujúcich ukoľajnení
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV. kvartál	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

SO 08-33-01		Čadca štátna hranica ČR/SR, rekonštrukcia žel. mostov v nžkm 279,461 58 (ev.km 281,628)
Opis priebehu prác:	07 - 09/2023	zriadenie základových pätiiek z betónu, montáž stožiarov TV, montáž konzol, montáž lán, montáž trakčných vodičov, demontáže jestvujúcich základov TV, stožiarov, vodičov a lán TV zriadenie ukoľajnenia s prierazkou, montáž lana FeZn, demontáže jestvujúcich ukoľajnení. Zarážanie skúšobných štetovnic.
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV. kvartál	IVQ/2023	Demontáž PHS, demontáž stávajúcej mostnej konštrukcie, práce na zakladaní mostného objektu, zarážanie štetovnic

SO 08-33-06		Čadca štátna hranica ČR/SR, nový železničný most v nžkm 281,484 08
Opis priebehu prác:	09/2023	Zarážanie štetovnic, odkopy pre uloženie tiahel, osadenie tiahel. Realizácia priťažovacej lavice OP1, P2, vrtnej plošiny P2, P3, plošiny pre žeriav. Realizácia vrtnej plošiny P2 a P4, realizácia predvrtov pre larzeny a zásyp, realizácia prístupovej cesty k P4, zarážanie larzen P2, P3, OP1, vŕtanie kotiev. Vŕtanie a injektáž kotiev, odkop krídel KP1 a OP1, betonáž podkladného betónu opory OP1
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV. kvartál	IVQ/2023	Realizácia mikropilót

SO 08-33-10		Čadca štátna hranica ČR/SR, zárubný múr pri kol. č. 1
Opis priebehu prác:	07-09/2023	Realizácia VPP, rozbíjanie hláv VPP, montáž armatúry, debnenia a betonáž rímsy.
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV kvartál :	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

SO 08-37-03		Čadca štátna hranica ČR/SR, preložka vodovodu SEVAK DN 300 a DN 100
Opis priebehu prác:	09/2023	Odstránenie zvyšky azbestocementovej krytiny. Výkop zeminy, montáž paženia, zhotovovanie lôžka, zváranie potrubia, montáž signálneho vodiča, obsyp potrubia, montáž ochrannej fólie, hutnenie zeminy. Výkop zeminy, montáž paženia, zhotovovanie lôžka, zváranie potrubia, montáž signálneho vodiča, obsyp potrubia, montáž ochrannej fólie, hutnenie zeminy
Analýza:		Stavebné práce na objekte sú v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV. kvartál	IVQ/2023	Pokračovanie prác v zmysle PD

SO 08-38-01		Čadca štátna - hranica ČR/SR, prístupová komunikácia cez rieku Čierňanka
Opis priebehu prác:	09/2023	Výmena podložia, pokládka geotextílie, hutnenie, realizácia statickej zaťažovacej skúšky. Odstránenie nebezpečnej skládky - azbest
Analýza:		Stavebné práce na objekte sa vykonávali v súlade s predpokladaným Harmonogramom prác.
Prognóza na IV. kvartál	IVQ/2023	Práce v zmysle PD.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

6.2 Kontrola kvality

Predložené doklady kvality sú posudzované v zmysle platných VTPKS, STN, interných predpisov ŽSR a súvisiacich nariadení. Kvalita určených výrobkov a stavebných výrobkov musí byť v zmysle PD a zodpovedať ustanoveniam zákona č. 133/2013 Z.z., a č. 513/2009 Z.z.

Kvalitár SD si vedie evidenciu predložených dokladov kvality, Materiálovú knihu, evidenciu pre TP, KSP a Povoľovacie listy pre potreby SD a ŽSR.

Proces schvaľovania KSP s Objednávateľom sa uskutočňuje formou e-mailu.

Protokoly o vykonaných skúškach v zmysle schválených KSP pre jednotlivé PS/SO Zhotoviteľ predkladá SD vo fakturáciách, keď danú položku fakturuje.

Za 3. kv. 2023 pre sekciu A boli predložené a schválené nasledovné dokumenty kvality:

Technologické postupy

TP č. 25/2023, SO 08-33-10, TP pre realizáciu obkladu pilótvej steny,

TP č. 26/2023, SO 08-33-10, TP pre rozvody nn a osvetlenie zastávky,

TP č. 37/2023, SO 08-33-10, TP pre veľkopriemerové pilóty,

TP č. 38/2023, SO 08-33-10, TP pre železobetónové konštrukcie,

TP č. 39/2023, SO 08-33-06, TP pre štetovnicové steny a predvrty,

TP č. 09.1/2023, SO 08-38-01, TP pre prístupovú komunikáciu cez rieku Čierňanka,

TP ev.č. 4088-10-1717, SO 08-34-01.A, TP pre PKO + dodatok č.1, ako súčasť VTD

TP č. 43/2023, SO 08-33-01, SO 08-33-03, SO 08-33-04, TP pre realizáciu štetovnicových stien a rozpier.

Kontrolne a skúšobné plány

KSP 44/2023, SO 08-33-10.A, KSP - Štátna hranica ČR/SR, veľkopriemerové pilóty,

KSP 45/2023, SO 08-33-06.A, KSP - Štátna hranica ČR/SR, štetovnicové steny a predvrty,

KSP 20.2/2023, SO 08-38-01.A, KSP - Štátna hranica ČR/SR, prístupová komunikácia cez rieku Čierňanka,

KSP 46/2023, SO 08-33-06, KSP - Štátna hranica ČR/SR, nový železničný most v nžkm 281,484 080,

KSP 35/2023, SO 08-32-52.A, KSP - Štátna hranica ČR/SR, rekonštrukcia priepustu v nžkm 280,625 100,

KSP 32.1/2023, SO 08-35-23.A, KSP - Štátna hranica ČR/SR, rozvody NN a osvetlenie zastávky,

KSP 43/2023, SO 08-33-10.A, KSP - Štátna hranica ČR/SR, realizácia obkladu pilótvej steny.

Materiálové listy

Materiálový list číslo ML	Sekcia A/B	SO	Názov materiálu	Výrobca	Miesto/ účel použitia
2022/M/15 - doplnenie č. 1	A	PS 08-22-04.A	PP tvarovky pre spájanie s PE potrubím: spojky pre HDPE 40mm, koncovky pre HDPE 40 MM	Core TEL s.r.o., K cintorínu 64, 010 04 Žilina	preložka káblov
2022/M/16 - doplnenie č. 1	A	PS 08-22-04.A	Optická chránička HDPE 40/30	Core TEL s.r.o., K cintorínu 64, 010 04 Žilina	preložka káblov
2022/M/22 - doplnenie č. 1	A,B	SO 08-35-01 A+B SO 08-35-02.A+B	Trolejové vedenie Typ J - 3 kV	Elektrizace železnic Praha a.s.,	TV, ukoľaj. ocel'. k-cii
2022/M/23 - doplnenie č. 1	A,B	SO 08-35-01 A+B SO 08-35-02.A+B	Trolejové vedenie Typ S - 25 kV	Elektrizace železnic Praha a.s.,	TV, ukoľaj. ocel'. k-cii

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

2023/N/11 - doplnenie č. 1	A	PS 08-22-04.A	<u>optický bábel A-DQ(ZN)2Y 48 vlákno</u>	Core TEL s.r.o.,	preložka kábllov
2023/M/54 - doplnenie č. 1	A	SO 08-37-03.A	<u>Tesniaca manžeta N</u>	"INTEGRA" Maliz	inžinierske siete
2023/M/58 - doplnenie č. 1	A	SO 08-37-03.A	<u>HDPE rúra plastová PE 100 SDR 17/PN 10. HDPE rúra plastová PE 100 SDR 11/PN 16</u>	CAMPRI spol. s.r.o.	preložky IS
2023/M/59 - doplnenie č. 1	A	SO 08-37-03.A	<u>Elektro tvarovky oblúk SDR 11, SDR 17</u>	WAVIN Ekoplastik s.r.o.	preložky IS
2023/M/62	A	SO 08-37-03	<u>Vyhľadávací vodič</u>	VUKI a.s.	prekládka IS
2023/M/33 - doplnenie č.3	A,B	SO 08-38-01 SO 08-33-02 SO 08-37-(1-5)	<u>kamenivo 63/125 mm , 0/4mm, 0/125mm, 0/63mm, 32/63mm</u>	Kamenivo Nord 1	Zemné práce
2023/M/64	A	SO 08-37-03, SO 08-37-05, SO 08-37-02	<u>Zvárané oceľové rúry DN 630</u>	JSC lizhora Pipe Mill	oceľová chránička
2023/M/1 - doplnenie č. 4	A,B	SO všetky SO/PS	<u>Oceľová rebierková výstuž valcovaná za tepla B500B v tyčiach priemerov :10, 12,20,25,32mm</u>	ÓAM ÓzdiAcélmu vek Kft., Maďarsko	betonárska výstuž
2023/M/37.1	A	SO 08-32-52 A SO 08-32-54 A	<u>ŽB rúry DN 800, DN 1200</u>	CS-BETON Prefa s.r.o.	ŽB rúry - priepusty
2023/M/70	A	SO 08-32-51	<u>Betónové prefabrikáty. Rámové (skriňové) priepusty</u>	Váhostav - Sk - Prefa, s.r.o.	železobetónov ý priepust
2022/M/11- doplnenie č. 1	A	SO 08-33-01 A SO 08-33-04 A SO 08-33-06 A SO 08-33-11 A	<u>Konštrukčné kovové profily valcované za tepla - Štetovnice tvaru "U", S 355GP</u>	Vítkovice Steel, a.s.,	Realizácia štetovnicových stien a rozpier
2023/M/4.1 - doplnenie č. 1	A	So 08-32-53 A	<u>Korugovaná rúra DN 1000</u>	Polieco Slovakia s.r.o.	odvodnenie priepustu
2023/M/73	A	SO 08-33-06 pre Oporu	<u>Trvalá lanová kotva s 1-15 sedemdrôtovými predpínacími pramencami</u>	Zakladaní staveb a.s., Praha	Stabilizácia objektu
2023/M/58 - doplnenie č. 2	A,B	SO 08-36-02 (A+B)	<u>HDPE rúra plastová PE 100 SDR 17/PN 10. HDPE rúra plastová PE 100 SDR 11/PN 16</u>	CAMPRI spol. s.r.o.	preložky kábllov
2022/M/11 - doplnenie č. 2	A,B	Všetky SO/PS kde sa vyžaduje zakladanie štetovnicovými stenami	<u>Konštrukčné kovové profily valcované za tepla - Štetovnice tvaru "U", S 355GP</u>	Vítkovice Steel, a.s., Českobrat ská 3321/46, 702 00 Ostrava, ČR	zakladanie štetovnicovými stenami
2022/M/17 - doplnenie č. 1	A,B	Všetky PS/SO kde sa vyžaduje spriahnutie štetovnicových stien	<u>Oceľ na vystužovanie betónu so závitovými rebierkami OTB500/550 v tyčiach 32mm</u>	Liberty Ostrava, a.s.	spriahnutie štetovnicových stien
2023/M/27 - doplnenie č. 1	A,B	Všetky SO/PS vyžadujúce penetráciu/izoláciu	<u>Lak asfaltový Renolak ALN</u>	PARAMO a.s.	SO/PS vyžadujúce penetráciu/izol áciu
2023/M/28- doplnenie č. 2	A,B	Všetky SO/PS vyžadujúce penetráciu/izoláciu	<u>Lak asfaltový PENETRAL ALP</u>	PARAMO a.s.	SO/PS vyžadujúce penetráciu/izol áciu
2023/M/20 - doplnenie č. 1	A	SO 08-32-51	<u>Geotextília netkaná 300g Tatrax PP GTX N 300</u>	GTEX, s.ro.	ochranná vrstva
2023/M/45 - doplnenie č. 2	A,B	SO 08-32-02.A,B	<u>Geosytetická tesniaca rohož - geokompozit Tatrabent</u>	GTEX, s.r.o.	zemné práce

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

6.3 Geotechnický dozor

V rámci stavby "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa" **SEKCIA A**, boli na stavbe vykonávané v období **júl - august - september 2023** nasledovné práce geotechnického charakteru a činnosť geotechnického dozoru.

Júl 2023

Spolu boli v Júli 2023 v rámci GTM vykonané

- SO 08-33-06 : ťažba a odvoz navážok , kontrola stability svahu ,
- monitoring HG vrtov a HOV, meteo SO 08-33-10
- merania GTM – IN merania SO 08-33-10
- merania HPV – snímače vo vrtoch SO 08-33-10

- v rámci geologického dozoru (GD) vykonané

- SO 08-33-10 : vŕtané a dokumentované pilóty B-16, B-11, B-01 v súlade s predpokladom;
- vŕtané a dokumentované pilóty C13 – C21 , C23 – C25 predĺžené o 1 m do podlažia bez armokošov,
- pilóty C12 , C22 , C26 zmena oproti predpokladu

- v rámci vodných zdrojov (VZ) vykonané

- monitoring , snímače a kvalita pre vybrané VZ SO 08-33-04, SO 08-33-06, SO 08-33-10

Namerané hodnoty nesignalizujú pohyb masívu.

August 2023

Spolu boli v auguste 2023 v rámci GTM vykonané

- SO 08-33-06 : kontrola svahu
kontrola svahov – trhlina
- monitoring HG merania vrtov a HOV SO 08-33-10
- merania GTM – IN merania SO 08-33-10

- v rámci geologického dozoru (GD) vykonané

- SO 08-33-06 : pre pilier 3 - vŕtaný a dokumentovaný predvrt S10 pre štetovnice , vŕtané a dokumentované pilóty P1 a P27

pilier P2 – predvrt pilóta P11 a P17, P1 a P27 štetovnice do hĺbky 6m áno , hlbšie nie – paleogén

opora OP1 – predvrt pilót 101, 112, 128 dokumentácie pre štetovnice

- SO 08-33-10 : vŕtané a dokumentované pilóty F1, E26, E1, D13 v súlade s predpokladom;
- vŕtaná pilóta D5 na základe geológie pokyn o predĺženie pilót D2, D3, D4, D6, D7, D8 o 1 m bez armokošov,
- vŕtané a dokumentované pilóty F28, F24, F55 ; pilóta D 10 – výskyt pieskovcov
- vŕtané a dokumentované pilóty B75, B53, B33 , D34, F18, F65
- SO 08-33-01 : pokusné zarážanie štetovnic 4ks , možno zaraziť do 6m a 9m hĺbky , 12m hĺbky nie
- SO 08-33-04 : pokusné zarážanie štetovnic 5ks , štetovnice nemožno zaraziť do požadovaných hĺbok

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

- v rámci vodných zdrojov (VZ) vykonané

- meranie kvality vody v studni SO 08-33-10 VZ 375 ,
 - monitoring , snímače a kvalita pre vybrané VZ SO 08-33-04, SO 08-33-06, SO 08-33-10
- Namerané hodnoty nesignalizujú pohyb masívu.

September 2023**Spolu boli v septembri 2023 v rámci GTM vykonané**

- SO 08-33-06 : kontrola svahu , lokálny zosuv , kontrola svahu
 - monitoring HG merania vrtov a HOV SO 08-33-10
 - merania GTM – IN merania SO 08-33-10
- oprava vrtu IN 14-6

- v rámci geologického dozoru (GD) vykonané

SO 08-33-06 : opora OP1 – dokumentácia základovej škáry a pre OP1 a krídlo OP1

pilier P2 – predvrt pilóta P11 a P17, P1 a P27 štetovnice do hĺbky 6m áno , hlbšie nie – paleogén

pilier OP1 – predvrt pilót 101, 112, 128 dokumentácie pre štetovnice

SO 08-32-52 : pokusné zarážanie štetovnic nemožno zaraziť do 9m a 12m hĺbky v zmysle DRS

- v rámci vodných zdrojov (VZ) vykonané

- monitoring , snímače a kvalita pre vybrané VZ SO 08-33-04, SO 08-33-06, SO 08-33-10
- Namerané hodnoty nesignalizujú pohyb masívu.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca



6.4 Autorizovaný geodet

V sledovanom období na poli geodézie a kartografie SD vykonával nasledovné činnosti:


- kontrola a prevzatie geodetických protokolov ku GTM,
- kontrola a prevzatie geodetických protokolov k fakturácii,
- kontrola projektu na preloženie bodov vytyčovacej siete diaľnice – NDS,
- konzultácie s AGK zhotoviteľa,
- účasť na kontrolných dňoch stavby.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

6.5 Environmentálny expert

<div></div> <div>Kvartálna správa environmentálneho StD 3Q2023</div>	
SEKCIA A	
Stavba:	ŽSR, modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa
Obdobie:	júl, august, september 2023
Popis činnosti:	Kontrola dodržiavania podmienok a povolení s ohľadom na ochranu životného prostredia.
Oblasti	Kontrolná činnosť:
Voda – povrchová	Počas mesiacov júl, august, september 2023 boli kontroly zamerané na zabezpečenie stavebných mechanizmov proti úniku prevádzkových kvapalín na príslušných stavebných objektoch resp. stavebných dvoroch (viď protokoly z kontrol). Tak isto boli kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel na úseku odpadového hospodárstva (nakladanie so stavebným alebo komunálnym odpadom) tak aby sa predchádzalo možnému zhoršeniu kvality povrchových vôd.
Voda – podzemná	Z povoľovacej dokumentácie Rozhodnutie OU ŽP č. OU-CA-OSZP-2022/000706-008 zo dňa 30.3.2022 nevyplyvajú žiadne zásadné podmienky pre ochranu podzemných vôd.
Ovzdušie	Z povoľovacej dokumentácie Rozhodnutie OU ŽP č. OU-CA-OSZP-2014/005078 zo dňa 3.6.2014 nevyplyvajú žiadne zásadné podmienky pre ochranu ovzdušia.
Hluk	Z povoľovacej dokumentácie ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011 vyplyva potreba inštalácie protihlukových stien pri obytných zónach.
Odpad	V mesiaci september 2023 bol zhotoviteľ upozornený listom na dodržiavanie pravidiel na úseku odpadového hospodárstva vo vzťahu k omývaniu domiešavačov a uloženiu prebytočného betónu na jednotlivých stavebných objektoch. Zhotoviteľ doložil právoplatné splnomocnenie od objednávateľa ohľadom nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú na stavbe.
Biota	V mesiaci apríl 2023 boli ukončené výrubu drevín na väčšine stavebných objektov. V mesiaci júl 2023 bol zhotoviteľ upozornený listom na výskyt inváznej rastliny pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp. (syn. Reynoutria)), ktorá sa vyskytuje na medziskládke nžkm 280,500.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Pôda	<p>Z povoľovacej dokumentácie ako SP č. VD/42597/2019/Gr zo dňa 18.11.2019 vyplýva povinnosť aby zhotoviteľ na SO 08-33-01 predložil OÚ ŽP CA projekt depónií pôdy. Zhotoviteľ resp. objednávatel tento projekt nepredložil.</p> <p>Zhotoviteľ plný všeobecné podmienky ochrany pôdneho fondu, ktoré vyplývajú z povoľovacej dokumentácie.</p> <p>Skládky ornice sa nachádzajú na SO 08-33-10 v podobe menšej hroble a na dočasnej skládke v žel. Stanici Čadca pri 12 koľaji smerom na Svrčinovec.</p> <p>Zhotoviteľ nezabezpečuje starostlivosť o orniciu v zmysle platných predpisov na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy.</p> <p>Ostatná vyzískaná zemina je deponovaná na medziskládke v km 280,50 resp. odvážaná ako odpad na riadenú skládku.</p>		
Ostatné	Žiadne.		
Vypracované a schválené:	5. októbra 2023		
Vypracoval:	Peter Bačkor	Podpis:	

PRÍLOHA:

ID	Názov a číslo predpisu	Podmienky a opatrenia	Realizácia zhotoviteľom
12	SP č. 04071/2018/SŽDD/48 464 zo dňa 19.6.2018	Vše: Predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a komunikácií. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok	Podmienky sa plnia
13	SP č. 04071/2018/SŽDD/48 464 zo dňa 19.6.2018	Odpad: Likvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015	Podmienky sa plnia
14	SP č. 04071/2018/SŽDD/48 464 zo dňa 19.6.2018	Dodržiavať podmienky dotknutých orgánov	
17	SP č. VD/42597/2019/Gr zo dňa 18.11.2019 SO 08-38-01 prístupová cesta rieka Čierňanka SO 08-33-02 most Čadca	Voda: Protipovodňový plán Voda: Ochrana vodného toku, nepoškodzovať brehy, neohrozoť kvalitu povrchových vôd Pôda: Depónium stavebného materiálu bude 6,0 m od brehovej čiar	Podmienky sa plnia
18	SP č. VD/42597/2019/Gr zo dňa 18.11.2019 SO 08-38-01 prístupová cesta rieka Čierňanka SO 08-33-02 most	Vše: Dodržať podmienky OU ŽP CA Voda: Čierňanka nesmie byť využívaný na prejazd stavebných mech. Voda: Zabrániť únikom NL do vody Voda: Protipovodňový plán	Podmienky sa plnia

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

	Čadca		
19	SP č. VD/42597/2019/Gr zo dňa 18.11.2019 SO 08-38-01 prístupová cesta rieka Čierňanka SO 08-33-02 most Čadca	Biota: Vegetačné úpravy len pôvodnými drevinami Pôda: Prebytočnú zeminu umiestňovať len na skládky písomne odsúhlasené CHKO Kysuce	Podmienky sa porušujú
20	SP č. VD/42597/2019/Gr zo dňa 18.11.2019 SO 08-38-01 prístupová cesta rieka Čierňanka SO 08-33-02 most Čadca	Odpad: Skládkovanie Odpad: Pri nakladaní z NO postupovať v zmysle § 40, zákona 223/2001 Odpad: Nevyužitý odpad ponúknuť na materiálové zhodnotenie Odpad: Doklady ohľadom nakladania z odpadom	Podmienky sa plnia
22	SP č. VD/42597/2019/Gr zo dňa 18.11.2019 SO 08-38-01 prístupová cesta rieka Čierňanka SO 08-33-02 most Čadca	Pôda: Skrývka humusu a bilancia Pôda: Predložiť OU ŽP PLO, projekt s určeným depónií pôdy Pôda: Zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu	Podmienky sa porušujú
	SP. č. 1088/TS/2018 zo dňa 28.2.2019 SO 08-38-03, SO 08- 38-04, SO 08-35-05.1, SO 08-38-06, SO 08- 38-09 a SO 08-38-10 Svrčinovec	Vše: Výkopový materiál nebude umiestňovaný na miestne komunikácie. Vše: Čistenie miestnych komunikácií Odpad: Vzniknuté odpady likvidovať v súlade so zákonom Odpad: Prebytočná zemina bude umiestnená na skládku	Podmienky sa plnia
2	SP. č. 1088/TS/2018 zo dňa 28.2.2019 SO 08-38-03, SO 08- 38-04, SO 08-35-05.1, SO 08-38-06, SO 08- 38-09 a SO 08-38-10 Svrčinovec	Odpad: Zhromažďovať odpad tak aby nenarušil estetický ráz krajiny Odpad: Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním + povolenie Odpad: Pri nakladaní z NO postupovať v zmysle § 40, zákona 223/2001 Odpad: Nevyužitý odpad ponúknuť na materiálové zhodnotenie Odpad: Doklady ohľadom nakladania z odpadom	Podmienky sa plnia
	SP. č. 1063/TS/2018 zo dňa 28.2.2019 SO 08-37-01, SO 08- 37-04 a SO 08-35-25 Svrčinovec	Vše: Výkopový materiál nebude umiestňovaný na miestne komunikácie. Vše: Čistenie miestnych komunikácií Odpad: Vzniknuté odpady likvidovať v súlade so zákonom Odpad: Prebytočná zemina bude umiestnená na skládku	Podmienky sa plnia
2	SP. č. 1063/TS/2018 zo dňa 28.2.2019 SO 08-37-01, SO 08- 37-04 a SO 08-35-25 Svrčinovec	Odpad: Zhromažďovať odpad tak aby nenarušil estetický ráz krajiny Odpad: Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním + povolenie Odpad: Pri nakladaní z NO postupovať v zmysle § 40, zákona 223/2001 Odpad: Nevyužitý odpad ponúknuť na materiálové zhodnotenie Odpad: Doklady ohľadom nakladania z odpadom	Podmienky sa plnia
4	Rozhodnutie OU ŽP CA č. OU-CA-OSZP- 2019/000237-008 zo	Odpad: Zhromažďovať odpad tak aby nenarušil estetický ráz krajiny Odpad: Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním +	Podmienky sa plnia

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

	dňa 29.4.2019 SO 08-37-02, SO 08-37-03, SO 08-37-05 a So 08-37-06	povolenie Odpad: Pri nakladaní z NO postupovať v zmysle § 40, zákona 223/2001 Odpad: Nevyužitý odpad ponúknuť na materiálové zhodnotenie Odpad: Doklady ohľadom nakladania z odpadom	
4	Rozhodnutie OU ŽP CA č. OU-CA-OSZP-2019/000237-008 zo dňa 29.4.2019 SO 08-37-02, SO 08-37-03, SO 08-37-05 a So 08-37-06	Biota: Vegetačné úpravy len pôvodnými drevinami Pôda: Prebytočnú zeminu umiestňovať len na skládky písomne Biota: Nadchod pre zver, oploenie min. 2,5 m Biota: Nadchod pre zver, realizovať výsadbu vyšších drevín	Momentálne neaktuálne
4	Rozhodnutie OU ŽP CA č. OU-CA-OSZP-2019/000237-008 zo dňa 29.4.2019 SO 08-37-02, SO 08-37-03, SO 08-37-05 a So 08-37-06	Biota: Vegetačné úpravy len pôvodnými drevinami Pôda: Prebytočnú zeminu umiestňovať len na skládky písomne Biota: Nadchod pre zver, sklon svahu k Šlahorovmu potoku zmierniť na 1:1,5 Biota: Nadchod pre zver, oploenie min. 2,5 m Biota: Nadchod pre zver, realizovať výsadbu vyšších drevín	Momentálne neaktuálne
6	Rozhodnutie OU ŽP CA č. OU-CA-OSZP-2019/000237-008 zo dňa 29.4.2019 SO 08-37-02, SO 08-37-03, SO 08-37-05 a So 08-37-06	Vše: Nutné dodržať ochranu ŽP	Podmienky sa plnia
	Rozhodnutie OU ŽP č. OU-CA-PLO-2017/010448-005 zo dňa 20.11.2017	Pôda: Odníma poľnohospodársku pôdu na trvalo: CA – 0,0098 ha, SV – 3,5635 ha	Podmienky sa plnia
IV	Rozhodnutie OU ŽP č. OU-CA-PLO-2017/010448-005 zo dňa 20.11.2017 Pôda	Pôda: Pred začatím prác vykonať skrývku humusu Pôda: Predložiť vykonávací projekt depónií humusu Pôda: Zabezpečiť základnú starostlivosť pôdy (zaburinenie a nálet drevín) Pôda: Zabrániť poškodeniu okolitej pôdy	Podmienky sa porušujú
1-5	Rozhodnutie OU ŽP č. OU-CA-OSZP-2014/005280 zo dňa 5.6.2014 Odpad	Odpad: Zhromažďovať odpad tak aby nenarušil estetický ráz krajiny Odpad: Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním + povolenie Odpad: Pri nakladaní z NO postupovať v zmysle § 40, zákona 223/2001 Odpad: Nevyužitý odpad ponúknuť na materiálové zhodnotenie Odpad: Doklady ohľadom nakladania z odpadom:	Podmienky sa plnia
	Rozhodnutie OU ŽP č. OU-CA-OSZP-2014/005078 zo dňa 3.6.2014 Ovzdušie	Ovzdušie: nevyžaduje súhlas orgánu ochrany ovzdušia	Podmienky sa plnia
	Vyjadrenie OU ŽP č. OZ-CA-OSZP-2014/005109 zo dňa 22.7.2014 Biota	Biota: GL Šlahorov potok – zachovať prirodzený stav brehových porastov Biota: Vegetačné úpravy len pôvodnými drevinami Pôda: Prebytočnú zeminu umiestňovať len na skládky písomne Biota: Nadchod pre zver, sklon svahu k Šlahorovmu potoku zmierniť na 1:1,5 Biota: Nadchod pre zver, oploenie min. 2,5 m Biota: Nadchod pre zver, realizovať výsadbu vyšších drevín	Momentálne neaktuálne

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

	Rozhodnutie OU ŽP č. OU-CA-OSZP-2022/000706-008 zo dňa 30.3.2022 Voda	Voda: Výrub brehových porastov potoka Čiernanka v tesnej blízkosti priemyselného parku Podzávoz, lokality č. 79 a 80	Podmienky sa plnia
	Stanovisko CHKO Kysuce č. CHKOKY/163-002/2018 zo dňa 16.5.2018	Biota: GL Šlahorov potok – zachovať prirodzený stav brehových porastov Biota: Vegetačné úpravy len pôvodnými drevinami Pôda: Prebytočnú zeminu umiestňovať len na skládky písomne Biota: Nadchod pre zver, sklon svahu k Šlahorovmu potoku zmierniť na 1:1,5 Biota: Nadchod pre zver, oplotenie min. 2,5 m Biota: Nadchod pre zver, realizovať výsadbu vyšších drevín Biota: Technické riešenie nadchodu realizovať tak aby bolo možné napojenie na nadchod cez D3 a cestu I/11	Momentálne neaktuálne
	Rozhodnutie výrub drevín č. ŽP-453/2022/V-PS zo dňa 3.3.2022 Jesenského ulica	Biota: Výrub sa uskutoční v mimo vegetačnom období	Podmienky sa plnia
	Rozhodnutie výrub drevín č. OU-CA-OSZP-2022/00764-007 zo dňa 23.3.2022 na lokalitách 78, 81, 103, 106, 108, 109, 110 a 111 v ku Čadca a v lokalitách 82, 83, 84, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 134, 137 a 138 v ku Svrčinovec	Biota: výrub uskutočniť od 1.10 do 31.3.2023 resp. oprava rozhodnutia na 20.08 do 31.3.2023 Biota: zvyšky drevín neukladať do brehových porastov miestnych tokov a na podmáčané lokality	Podmienky sa plnia
	Rozhodnutie výrub drevín obec Svrčinovec č. OU-1-3-EB/2022-St zo dňa 3.2.2022 na lokalitách 85 až 102, 115 až 121, 123 až 133, 135 až 138.	Biota: výrub uskutočniť od 1. 10 do konca februára resp. oprava Rozhodnutia od 1.9 do konca februára	Podmienky sa plnia
13	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Hluk: Obytné zóny chrániť protihlukovými bariérami	Momentálne neaktuálne
19	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: SKUEV 0649 červený variant = analýza vplyvov na dotknuté biokoridory s dôrazom na hydrické a semiterestrické živočíchy	Momentálne neaktuálne
20	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: Realizácia nadchodu pre zver v 282,700 km	Podmienky sa plnia
21	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: Návrh technických opatrení na zachovanie priechodnosti biokoridoru SR/ČR	Podmienky sa plnia
25	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: Vykonať dendrologický a biologický prieskum	Podmienky sa plnia
27	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Odpad: Spresniť umiestnenie skládok stavebného materiálu	Podmienky sa plnia
29	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Odpad: Navrhnuť miesto ukladania nevhodnej zeminu, CHKO Kysuce	Momentálne neaktuálne
31	ZS č. 1796/2011 zo	Biota: Vegetačné úpravy	Momentálne

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

	dňa 8. apríla 2011		neaktuálne
33	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Pôda: Odsúhlasiť používanie pôdy na nepoľnohospodárske účely	Podmienky sa plnia
34	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Pôda: Odňatie poľnohospodárskej pôdy	Podmienky sa plnia
37	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: Minimalizovať zásahy do brehovej vegetácie	Momentálne neaktuálne
38	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: Výrub realizovať v mimohniezdnom období	Podmienky sa plnia
39	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: Mosty ponad malé vodné toky navrhnuť s priechodnosťou pre migrujúce živočíchy	Momentálne neaktuálne
40	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Pôda: Stavebné dvory umiestňovať mimo vodných tokov a sídel	Podmienky sa plnia
42	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Pôda: Dodržať plochy trvalého a dočasného záberu	Podmienky sa plnia
43	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Pôda: Depónie pôdy umiestňovať na pôdy s menšou kvalitou	Podmienky sa plnia
44	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Pôda: Vypracovať bilanciu skryvky humusu	Podmienky sa plnia
45	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Voda: Dodržať ochranné pásma vodárenských zdrojov	Podmienky sa plnia
47	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Voda: Súhlas podľa § 27/ ods.1), písm. a) vodného zákona	Podmienky sa plnia
48	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Vše: Minimalizovať sekundárnu prašnosť	Podmienky sa plnia
50	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Pôda: chrániť okolitú pôdu pred poškodeným, znehodnoteným a zamedziť kontaminácii pôdy nebezpečnými látkami napr. PHM	Podmienky sa porušujú
52	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Vše: Zabezpečiť čistenie komunikácií	Podmienky sa plnia
54	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Odpad: Viesť evidenciu o vzniknutom odpade	Podmienky sa plnia
55	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Odpad: Vypracovať podrobnejší spôsob nakladania z odpadmi	Podmienky sa plnia
56	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Odpad: Komunálny odpad prispôbiť VZN jednotlivých obcí	StD bude zisťovať
57	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Vše: Stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave	StD bude zisťovať
59	ZS č. 1796/2011 zo dňa 8. apríla 2011	Biota: Rekultivácia resp. spätná rekultivácia na základe projektu	Momentálne neaktuálne

VYSVETLIVKY: ID – podmienky v stavebnom povolení resp. v iných rozhodnutiach úradov, **Názov a číslo predpisu** – odkaz na spisovú značku alebo registračné číslo, **Podmienky a opatrenia** – konkrétne podmienky, ktoré vyplývajú zo súhlasu/stanoviska/rozhodnutia a pod., **Realizácia zhotoviteľom** – plnenie alebo neplnenie k aktuálnemu dátumu alebo časovému obdobiu podľa nižšie stanoveného farebného kódu

Podmienky sa plnia	V štádiu riešenia	Podmienky sa porušujú	StD bude zisťovať	Momentálne neaktuálne
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

6.6 Kontrola BOZP a PO na stavbe

V priebehu mesiacov 07, 08, 09 / 2023 boli vykonané pravidelné stretnutia koordinátora BOZP so zástupcom zodpovedným za BOZP Zhotoviteľa za účelom koordinovania základných zásad BOZP:

1. Zabezpečovania a uplatňovania všeobecných zásad BOZP, OPP, návrhy opatrení
2. Kontrola a pripomienkovanie bezpečných pracovných postupov a technologických postupov
3. Poskytovanie odborných konzultácií
4. Vykonávanie monitorovania BOZP podľa požiadaviek Objednávateľa
5. Prerokovanie dielčích problémov v oblastiach BOZP,OPP so špecialistom Zhotoviteľa
6. Vyhodnotenie nedostatkov z kontroly pracovísk

Mimoriadne udalosti a pracovné úrazy

Za sledované obdobie neboli zaznamenané žiadne pracovné úrazy.

Za sledované obdobie bola zaznamenaná 1 mimoriadna udalosť:

Dňa 07.09.2023 na SO 08-32-66 sa pri manipulácii s bremenom prevrátil žeriav EČV TN947GD.

Obsluha počas manipulácie so ZZ vysunula rameno žeriava do polohy, pri čom došlo k prevráteniu ZZ. Práce sa vykonávali počas traťovej a napäťovej výluky (ničkoľajka) a nebezpečnou udalosťou bol ohrozený priestor staveniska. V aktuálnom čase incidentu nebola ohrozená ani obmedzená železničná prevádzka na infraštruktúre ŽSR. B-príkaz bol prevzatý oprávneným pracovníkom Zhotoviteľa s platným oprávnením, pracovisko bolo zabezpečené vedúcim prác s platnými dokladmi, obsluha ZZ mala platné doklady na obsluhu ZZ, školenie z BOZP od UIVP ŽSR z 11.05.2023 platné do 10.05.2025, revízna skúška ZZ z 27.09.2022 platná do 27.09.2023.

V ohrozenom priestore ZZ pracovalo viacero zhotoviteľov, no pád ramena ZZ dopadol na kabínu nákl. vozidla, v ktorom sa vodič v danom čase nenachádzal.

Príčina mimoriadnosti - nesprávna manipulácia ZZ obsluhou ZZ (žeriavnik).

Stavebný dozor vyzval Zhotoviteľa o predloženie správy o nehodovej udalosti na stavenisku zo dňa 7.9.2023 v zmysle ZoD a Plánu BOZP stavby.

STD žiadal, aby súčasťou správy bolo: popis udalosti, stavebný objekt, zodpovedný vedúci prác, dohoda na spoločnom pracovisku, určenie príčiny nehodovej udalosti, zoznam prijatých opatrení k danej udalosti, revízna správa od ZZ, prevádzkový denník ZZ, vstup vozidla ZZ do obvodu dráhy ŽSR, školenie BOZP na ŽSR strojníka ZZ, preukaz obsluhy ZZ.

Zhotoviteľ predložil žiadané dokumenty a vykonal nápravné opatrenia.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

7. Kontrola harmonogramu prác a výhľad na ďalšie obdobie (kritická cesta)

SD na Koordinačnej porade č. 1 ako i na Kontrolnom dni č. 1 vyzval Zhotoviteľa na predloženie HMG prác členeného na jednotlivé sekcie po vecnej i finančnej stránke v súlade so ZoD.

Rovnako aj na 1. Kontrolnom dni SD požiadal Zhotoviteľa o predloženie vecného a finančného Harmonogramu prác. HMG musí byť spracovaný samostatne pre jednotlivé Sekcie vrátane znázornenia kritickej cesty.

Zhotoviteľ sa zdráha predložiť harmonogram prác na Lehotu výstavby = 25 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska a argumentuje tým, že okolnosti spojené so schvaľovaním plánu výluk s najväčšou pravdepodobnosťou vyústia do zmeny Lehoty výstavby, ktorá je vyvolaná aj posunutím termínu začatia stavebných prác o 3 mesiace, realizáciou 0. etapy resp. zmenou POV.

Problematika Harmonogramu prác, jeho plnenia a aktualizácie ako i POV je riešená na všetkých Kontrolných dňoch stavby, všetkých Koordinačných poradách, samostatnou korešpondenciou ako i na samostatných rokovaníach konaných na pôde ŽSR GR.

Po kontrole HMGP SD vydal oznámenie o nesúlade tohto HMG s Lehotou výstavby a požiadal o predloženie HMG prác, ktorý bude vychádzať z harmonogramu predloženého v ponuke Zhotoviteľa. SD v oznámení požiadal Zhotoviteľa o vysvetlenie, prečo sa nevyvíja stavebná činnosť na úseku vylúčenej koľaje ako i na SO, ktoré nie sú závislé od výluky.

Objednávateľ priebežne na KD a KP upozorňuje, že s predĺžením Lehoty výstavby sa neuvažuje a žiada Zhotoviteľa o dodržanie Lehoty výstavby v súlade so ZoD.

Vyhodnotenie HMGP:

Aktuálne sledovaný cyklogram stavebných prác uvažuje s termínmi realizácie jednotlivých PS a SO v rámci aktuálne prebiehajúcej etapy č. 2. Po kontrole HMGP SD vydal oznámenie o nesúlade tohto HMG s Lehotou výstavby a požiadal o predloženie HMG prác, ktorý bude vychádzať z harmonogramu predloženého v ponuke Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ dňa 29.9.2023 predložil aktualizovaný HMG prác – úloha splnená.

SD upozornil, že kontrolou predloženého aktualizovaného HMG bol zistený nesúlad medzi lehotou výstavby vyplývajúcej z aktualizovaného HMG a lehotou výstavby uvedenej v ZoD.

Objednávateľ upozorňuje, že s predĺžením Lehoty výstavby sa neuvažuje a žiada Zhotoviteľa o dodržanie Lehoty výstavby (t. j. do 27.9.2024) v súlade so ZoD.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

8. Grafické znázornenie finančného a fyzického plnenia ZoD, sekcia A

Stavba „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“ je z dôvodu rôznych zdrojov financovania rozdelená do dvoch Sekcií:

Sekcia A: Čadca – Svrčinovec, zastávka

Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR

Sekcia A: Čadca/mimo/ – Svrčinovec zastávka (2,7 km) má už z roku 2020 podpísanú zmluvu o financovaní z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu. Celková suma grantu je takmer 47 miliónov eur (z toho: príspevok EÚ: 39 883 237 eur a príspevok ŠR: 7 038 218 eur). V rámci grantu bude financovaný aj stavebný dozor, ktorý však je predmetom samostatného verejného obstarávania.

Zdroj: <https://www.zsr.sk/pre-media/aktuality/region-kysuc-caka-vyznamna-modernizacia.html>

Rozsah fyzického plnenia resp. progres v realizácii stavebných prác na stavbe približne zodpovedá krivke znázorňujúcej finančné čerpanie stavby. Pre účely grafického znázornenia sú občasné rozdiely medzi vykonanými prácami a prácami fakturovanými minimálne a nemajú zásadný vplyv na priebeh krivky grafu.


Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Tabuľka plnenia ukazovateľov pokroku stavby (fyzické a finančné indikátory) Sekcia A

Zmluva o dielo č.: ZOD/21012/001
Stavba: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca –
Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa
Čadca – Svrčinovec, Sekcia A
Združenie „ŽSR, KYSUCE“, zastúpené vedúcim členom TSS GRADE,
a.s.
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky
Stavebný dozor: Inžinierske združenie Bung - Infram
Zmluva na poskytnutie služby: IZ BUNG-INFRAM/ZSR/2022/001

Obdobie	plán		skutočnosť	
	mesačne	kumulatív	mesačne	kumulatív
08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2022	117 306,80	117 306,80	0,00	0,00
11/2022	144 705,54	262 012,34	0,00	0,00
12/2022	0,00	262 012,34	0,00	0,00
01/2023	0,00	262 012,34	48 506,00	48 506,00
02/2023	0,00	262 012,34	0,00	48 506,00
03/2023	332 734,95	594 747,29	148 463,69	196 969,69
04/2023	3 297 546,78	3 892 294,07	500 718,88	697 688,57
05/2023	3 644 491,49	7 536 785,56	301 570,15	999 258,72
06/2023	4 373 772,25	11 910 557,81	380 828,02	1 380 086,74
07/2023	4 707 609,84	16 618 167,65	288 447,73	1 668 534,47
08/2023	4 342 109,97	20 960 277,62	988 245,46	2 656 779,93
09/2023	4 049 068,83	25 009 346,45	237 102,25	2 893 882,18
10/2023	3 765 638,50	28 774 984,95	0,00	
11/2023	3 731 256,55	32 506 241,50	0,00	
12/2023	315 524,52	32 821 766,02	0,00	
01/2024	0,00	32 821 766,02		
02/2024	0,00	32 821 766,02		
03/2024	338 471,76	33 160 237,78		
04/2024	2 654 813,81	35 815 051,59		
05/2024	3 197 626,69	39 012 678,28		
06/2024	3 966 410,47	42 979 088,75		
07/2024	2 330 588,63	45 309 677,38		
08/2024	2 346 723,63	47 656 401,01		
09/2024	298 898,39	47 955 299,40		
Spolu	47 955 299,40	47 955 299,40		

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

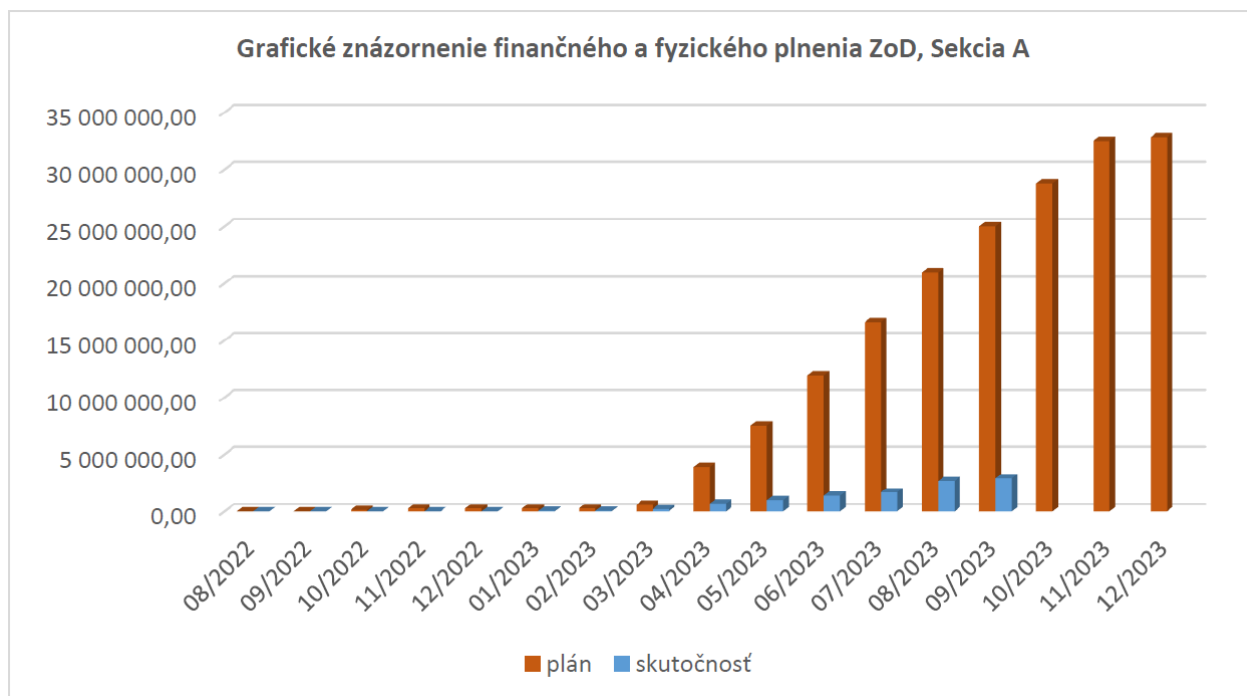

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

9. Problémy na stavbe a ich riešenie

Problémy stavby sa riešia na Kontrolných dňoch, Koordinačných poradách ako i na samostatných rokovaníach a samostatnou korešpondenciou.

Problémovými uzlami stavby z pohľadu realizácie stavebných prác na jednotlivých navzájom súvisiacich a ovplyvňujúcich sa SO možno označiť predovšetkým :

- Z pohľadu možných komplikácií vo výstavbe nemožno nespomenúť geologicky náročné zosuvné územie v dvoch úsekoch, v ktorých sa má vykonať sanácia svahov avšak skutočný rozsah stav. prác potrebných na zvládnutie geológie flyšu sa môže zmeniť.
V tejto súvislosti Zhotoviteľ vydal Oznámenie č. 15, ktorými upozorňuje na existenciu svahových deformácií v okolí SO 08-33-06 Čadca - štátna hranica ČR/SR, nový železničný most v nžkm 281,484 08 ako i na nevyhovujúce penetračné skúšky podložia v mieste budovania tohoto MO. Z dôvodu odlišnej geologickej stavby záujmového územia v okolí SO 08-33-06 došlo ku zmene resp. k aktualizácii PD zo strany AD/Projektanta a to tak, že AD v zmysle kolobehu Dokumentácie odstúpil aktualizovanú DRS na 1. stabilizáciu výkopu jamy pre základ opory č. 1 (dodatočné vybudovanie štetovnicovej steny + kotvenie lanovými kotvami) a 2. úpravu a doplnenie mikropilót na založenie mostnej opory č. 1 a príslušného oporného múru. Vo veci samotnej realizácie štetovnicových stien pre zakladanie mostných podpier v paleogénnych horninách Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi Ponuku č. 8, predmetom ktorej je realizácia predvrtov, Ponuku Objednávateľ akceptoval.

Ďalej v súvislosti s SO 08-33-10 Čadca - štátna hranica ČR/SR, zárubný múr pri kol. č. 1 (nžkm 281,605 - 282,080) Zhotoviteľ vydal Oznámenie č. 24 – zmena technológie zhotovenia podzemnej steny zárubného múru. Tu SD požiadal AD o stanovisko k technickému riešeniu navrhovaného Zhotoviteľom. Následne SD požiadal Objednávateľa o predchádzajúci súhlas, súhlas Objednávateľa bol SD doručený dňa 19.6.2023, následne SD vydal Zhotoviteľovi Pokyn č. 11 na realizáciu prác v zmysle Ponuky č. 9 a Súhlasu Objednávateľa. V zmysle Pokynu Zhotoviteľ realizuje stavebné práce.
- Počas realizácie prác Zhotoviteľ objavil existenciu nelegálnych skládok, predovšetkým sa jedná o domový resp. komunálny odpad O tejto skutočnosti SD informoval zástupcu Objednávateľa. V jednej lokalite Zhotoviteľ nahlásil existenciu skládky NO (azbest). V súvislosti s Oznámeniami Zhotoviteľa SD požiadal Objednávateľa o súhlas na vydanie Pokynu na odstránenie nelegálnych skládok. Nelegálne skládky sa riešia v zmysle usmernenia Objednávateľa (prejednané na KD) priebežne pre každý prípad samostatne, táto evidencia je zrejmá z evidencie Oznámení a Nárokov Zhotoviteľa. V sledovanom období boli evidované skládky azbestu odstránené. Aktuálne sa na stavenisku nachádzajú skládky komunálneho odpadu, s ich likvidáciou Zhotoviteľ nezačal.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

- K termínu spracovania tejto správy Zhotoviteľ dňa 29.9.2023 predložil aktualizáciu harmonogramu prác, ktorý však nerešpektuje Lehotu výstavby = 25 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Vzhľadom na to, že SD nemá kompetenciou meniť Zmluvu, nemôže teda ani odsúhlasiť Zhotoviteľom predkladanú aktualizáciu HMG prác v rozpore so ZoD. SD trvá na predložení HMGP v súlade so ZoD, podčl. FIDIC 8.3 Harmonogram Prác.

Všetky nedostatky sa riešia v súlade so ZoD a priebežne podľa ich priority tak, aby nebola ohrozená realizácia stavebných prác, termíny ani lehoty.

V sledovanom období nedošlo na stavbe k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

10. Riziká a odporúčania stavebného dozoru

Z pohľadu dodržania Zmluvy o Dielo, a to predovšetkým lehoty výstavby, kvality stavebných prác, podmienok čerpania nenávratného finančného príspevku a BOZP, stavebný dozor odporúča:

a) pre Zhotoviteľa stavebných prác:

- zvýšiť mieru zodpovednosti Podzhotoviteľov za dodržiavanie termínov a kvalitu prác,
- prijať opatrenia na zamedzovanie a predchádzanie vzniku kvalitatívnych nedostatkov a chýb na realizovaných stavebných konštrukciách s cieľom zabezpečenia životnosti diela, ako i z dôvodu bezpečnej prevádzky a užívania diela,
- prijať opatrenia na zvýšenie kvality stavebných prác,
- zabezpečiť dodržiavanie technologických postupov a postupov navrhnutých projektantom a postupov schválených objednávatelom alebo SD,
- zvyšovať tlak na kvalitu prác vykonávanú vlastnými kapacitami a predovšetkým zmluvnými podzhotoviteľmi,
- prijať opatrenia na zvýšenie rozpracovanosti jednotlivých SO napr. zvýšením počtu robotníkov a stavebnej mechanizácie,
- pri zistení nesúladu PD vyplývajúceho z posúdenia PD na TSI je potrebné postupovať v súlade s R2 ŽSR, Zabezpečenie interoperability na ŽSR, účinných od 1.10.2010,
- pri vykonávaní skúšok a predkladaní potrebnej dokumentácie je nutné postupovať v zmysle platných VTPKS,
- zlepšiť systém evidencie oznámení/nárokov,
- dbať na včasné predkladanie oznámení,
- dbať na včasné predkladanie podkladov ku zmenovému konaniu,
- zlepšiť spoluprácu s autorským dozorom pri zabezpečovaní podkladov ku zmenám PD,
- zlepšiť organizáciu výstavby a koordináciu stavebných postupov,
- prijať opatrenia na dodržanie HMG prác a teda aj Lehoty výstavby Diela v súlade so ZoD, predovšetkým však v požadovanej Kvalite a Cene,
- zvážiť možnosť aplikácie podrobnejších stavebných postupov,
- prijať opatrenia (technické, personálne, koordinačné) na zamedzenie vzniku mimoriadnych udalostí

b) pre objednávatel'a:

- zabezpečiť dodávanie chýbajúcej či opravenej PD v požadovanom rozsahu a termíne,
- pre potrebu zmenových konaní prijať opatrenie na zlepšenie spolupráce a komunikácie účastníkov stavby s AD,
- včas zabezpečovať zmluvy a dohody s tretími stranami,
- vyžadovať od AD zabezpečenie inžinierskej činnosti na tie časti stavby, pri ktorých došlo ku zmenám.

V ďalšej činnosti na stavbe je nutné, aby Zhotoviteľ vždy dodržiaval aktualizovaný harmonogram prác. Zhotoviteľ má povinnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávatel'a alebo jeho zástupcu vypracovať a predložiť aktualizovaný HMG prác v súlade s čl. 8.3 FIDIC. Zhotoviteľ má taktiež právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia predložiť aktualizovaný HMG prác v súlade s čl. 8.3 FIDIC. Vlastný HMG prác by mal o. i. obsahovať aj lehoty potrebné na administratívne zúradovanie technických prehliadok, vyskúšanie Diela, preberacích konaní a kolaudácie stavby.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

11. Prehľad o vyzískanom materiáli a o jeho naložení

Doklady o vyzískanom materiáli v sledovanom období:



GRADE, a.s.

ZDRUŽENIE ŽSR,
KYSUCE

ŽSR - Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou(mimo), Železničná trať, 3. etapa

Vec: Zápisnica o odovzdaní a prevzatí železničného materiálu

Firma TSS Grade a.s. odovzdáva nasledovný vyzískaný železničný materiál:


- Nástupištné panely, 250 m
- Prvky nástupišťa „Tischer“, 250 m

Tento materiál bol rozobratý a materiál bol odovzdaný ŽSR SMSÚ OR ŽILINA.

Dňa: 28.7.2023

Za TSS Grade a. s.




Za ŽSR SMSÚ TO Čadca:

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca



GRADE, a.s.

**ZDRUŽENIE ŽSR,
KYSUCE**

ŽSR - Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou(mimo), Železničná trať, 3. etapa

Vec: Zápisnica o odovzdaní a prevzatí železničného materiálu

Firma TSS Grade a.s. odovzdáva nasledovný vyzískaný železničný materiál:

- Kofajové polia na betónových podvaloch, R65, dĺžka 640 m

Tento materiál bol uložený na skládke a odovzdaný ŽSR SMSÚ OR ŽILINA.

Dňa: 8.7.2023

Za TSS Grade a. s.


- 23 -
Dunajská 8
811 08 Bratislava
IČO: 35 802 723 IČ GPH: SK2020281571


Oblasť riaditeľstvo ŽSR
SMSÚ ŽSR Trávný obvod
Pracovisko Čadca
Stanúť 302, 022 01 Čadca


Za ŽSR SMSÚ TO Čadca:

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca



GRADE, a.s.

**ZDRUŽENIE ŽSR,
KYSUCE**



ŽSR - Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou(mimo), Železničná trať, 3. etapa

Vec: Zápisnica o odovzdaní a prevzatí železničného materiálu


Na SO 08.32.03 A boli v termíne od 1.8.-31.8.2023 vybraté kolajové polia na betóne v dĺžke 2209 m A rozobraté KP na betóne v dĺžke 230 m

Tento materiál bol uložený na skládke a odovzdaný ŽSR SMSÚ OR ŽILINA.

Dňa: 31.8.2023


Za TSS Grade a. s.

 **GRADE, a.s.** -23-
Dunajská 48
811 08 Bratislava
IČO: 35 802 723 IČ DPH: SK2020281571




Za ŽSR SMSÚ TO Čadca:

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca



GRADE, a.s.

**ZDRUŽENIE ŽSR,
KYSUCE**

ŽSR - Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou(mimo), Železničná trať, 3. etapa

Vec: Zápisnica o odovzdaní a prevzatí železničného materiálu


Na SO 08.32.03 B boli v termíne od 1.8.-31.8.2023 vybraté kolajové polia na betóne v dĺžke 2217 m .

Tento materiál bol uložený na skládke a odovzdaný ŽSR SMSÚ OR ŽILINA.

Dňa:31.8.2023

Za TSS Grade a. s.

 **GRADE, a.s.** -23-
Dunajská 48
811 08 Bratislava
IČO: 35 802 723 IČ OPH: SK2020281571



Za ŽSR SMSÚ TO Čadca:

Evidencia vyzískaného materiálu prebieha formou zavedenej agendy samostatných dokumentov uložených u zástupcu ŽSR - správcu, zhotoviteľa a SD.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

12. Evidencia odpadov

Okres: Čadca
 Sledované obdobie: 07/2023

ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať 3. etapa

Por. číslo	Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kateg. odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu (v tonách)	Spôsob nakladania s odpadom		Pozn.	Konečný spracovateľ	
						Kód	IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania		Kód	IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania
1	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O		4 703,90	O	35922648 ŽSD Slovakia s.r.o., Gallyayova 11, 841 02 Bratislava		D1	52468933 JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302 022 01 Čadca
2	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O		1 555,10	O	35922648 ŽSD Slovakia s.r.o., Gallyayova 11, 841 02 Bratislava		R5	53627610 STAPP s.r.o. Štrková 21 010 09 Žilina
3	10 01 01	Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04	O		2 172,00	O	35802723 TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava		D15	52468933 JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302 022 01 Čadca

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Okres: **Čadca**
 Sledované obdobie: **08/2023**

ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať 3. etapa

Por. číslo	Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kateg. odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu (v tonách)	Spôsob nakladania s odpadom		Pozn.	Konečný spracovateľ	
						Kód	IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania		Kód	IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania
1	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O		4 060,50	O	35922648 ŽSD Slovakia s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava		D1	52468933 JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302 022 01 Čadca
2	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O		2 096,30	O	35922648 ŽSD Slovakia s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava		R5	53627610 STAPP s.r.o. Štrková 21 010 09 Žilina
3	17 01 01	Betón	O		374,17	O	35802723 TSS GRADE, a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava		R13	53627610 STAPP s.r.o. Štrková 21 010 09 Žilina

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Okres: Čadca
 Sledované obdobie: 09/2023

ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať 3. etapa

Por. číslo	Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kateg. odpadu	Y-kód	Hmotnosť odpadu (v tonách)	Spôsob nakladania s odpadom		Pozn.	Konečný spracovateľ	
						Kód	IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania		Kód	IČO, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania
1	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O		2 249,60	O	35922648 ŽSD Slovakia s.r.o., Gallyayova 11, 841 02 Bratislava		D1	52468933 JOKO-EKO, s.r.o., Podzávoz 302 022 01 Čadca
2	17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O		1 515,02	O	35922648 ŽSD Slovakia s.r.o., Gallyayova 11, 841 02 Bratislava		R5	53627610 STAPP s.r.o., Šrková 21 010 09 Žilina
3	17 01 01	Betón	O		150,84	O	35922648 ŽSD Slovakia s.r.o., Gallyayova 11, 841 02 Bratislava		R13	53627610 STAPP s.r.o., Šrková 21 010 09 Žilina

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

13. Tabuľka preberacích konaní, predčasných užívaní a kolaudačných rozhodnutí

V sledovanom období sa uskutočnili technické prehliadky a konanie na predčasné užívanie na nasledovných SO:

SO/PS	Názov SO/PS	Rozsah dokončených prác	Technické prehliadky	Predčasné užívanie	Kolaudácia
08-35-01.A	Čadca - štátna hranica ČR/SR, trakčné vedenie, Sekcia A: Čadca - Svrčinovec	Ukončenie stavebného postupu č.1, ukončenie 1. etapy	16-19.6.2023	19.6.2023	Nie
08-35-02.A	Čadca - štátna hranica ČR/SR, ukoľajnenie ocelových konštrukcií, Sekcia A: Čadca - Svrčinovec	Ukončenie stavebného postupu č.1, ukončenie 1. etapy	16-19.6.2023	19.6.2023	Nie

V sledovanom období sa kolaudačné konanie nekonalo.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

14. Dokumentácia, ktorú Poskytovateľ vedie počas jeho činnosti na stavbe

Stavebný dozor v rámci svojej činnosti zabezpečuje komplexnú starostlivosť o Dokumentáciu stavby v súlade so Zmluvou na poskytnutie služby ako i so ZoD

Predovšetkým (resp. o. i.) sa jedná o starostlivosť o:

- Záznamy koordinačných porád - zasielané priebežne všetkým účastníkom
- Záznamy kontrolných dní stavby - zasielané priebežne všetkým účastníkom
- Záznamy v stavebných denníkoch
- Evidencia pošty (elektronická i v listinnej podobe)
- Evidenciu nárokov a oznámení
- Evidenciu kvality vykonaných prác
- Evidenciu súpisov vykonaných prác
- Evidenciu faktúr
- Evidenciu týždenných správ – hlásení Zhotoviteľa
- Evidenciu mesačných správ – Zhotoviteľa
- Evidenciu PD a zmien PD
- Evidenciu stanovísk a vyjadrení AD
- Evidenciu stanovísk a vyjadrení Objednávateľa
- Evidencia Ponúk Zhotoviteľa
- Evidencia Pokynov SD
- Evidencia TP, HP
 - o Pasportizácia vodných zdrojov
 - o Pasportizácia MK v meste Čadca
 - o Výsledky z doplňujúceho GTM monitoringu

Aktualizácia PD – dňa 31.1.2023 listom č. 291/1004/3/2023/33/Ku bola zo strany AD na stavbu predložená aktualizácia PD, paré č. 11,12 (Zhotoviteľ), paré č. 13 (SD).

V sledovanom období SD v spolupráci so Zhotoviteľom pripravil návrh Dodatku k ZoD č. 1, konečná podoba Dodatku k ZoD bola odstúpená Objednávateľovi na Ďalšie spracovanie listom č. 271/2023/IZBI/MF zo dňa 22.6.2023. Podpisom Dodatku č. 1 dôjde k navýšeniu Ceny Diela, Lehota Výstavby sa nemení. Dodatok č. 1 k ZoD bol podpísaný dňa 26.7.2023

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

15. Záznamy v stavebnom denníku

Stavebný dozor v rámci svojej činnosti zabezpečuje priebežnú kontrolu vedenia stavebných denníkov vrátane vykonávania záznamov súvisiacich s kontrolou a preberaním vykonaných prác pred ich zakrytím, s kontrolou kvality vykonaných prác, prípadne iné záznamy podľa potreby. Rozsah zápisov v stavebných denníkoch zodpovedá rozsahu vykonávaných prác na SO v Sekcii A.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

16. Zoznam Oznámení Zhotoviteľa

Číslo	Názov oznámenia	Dátum doručenia	Názov	SO/PS	Stručný popis oznámenia	Reakcia SD	Poznámka/Súvisiace
1.	Oznámenie Predstaviteľa Zhotoviteľa	11.4.2022	Oznámenie č. 1	celá stavba	Oznámenie Predstaviteľa Zhotoviteľa Objednávateľovi		
2.	Stavebný dozor	11.4.2022	Oznámenie č. 2	celá stavba	Žiadosť Objednávateľa o zadanie kontaktných údajov Stavebného dozoru a jeho asistentov		
3.	Alternatíva komunikácia	16.6.2022	Oznámenie č. 3	SO - 08-33-17, SO - 08-33-21, SO - 08-38-10	Vydanie pokynu a vypracovanie zmenovej PD z dôvodu nevyhovujúcej výšky železničného mostu SO 08-33-17		súvisí s Nárokom č. 5
4.	Oprava zrejmej chyby v pílení v časti číso ZbD	29.6.2022	Oznámenie č. 4	celá stavba	Omylom uvedené iné číslo zmluvy v korešpondencii		
5.	Zoznam zamestnancov a strojov	2.8.2022	Oznámenie č. 5	celá stavba	Predloženie zoznamu zamestnancov Zhotoviteľa		
6.	Diagnostika mosta ponad Šišorov potok - Svrčinovec	15.8.2022	Oznámenie č. 6	SO - 08-33-17, SO - 08-33-21, SO - 08-38-10	Nezhodujúci stav Čestného mosta		súvisí s Nárokom č. 5
7.	Bludné prúdy	5.9.2022	Oznámenie č. 7	celá stavba	Základné meranie bludných prúdov pred rozostatím koľajiska		CP č. 2, CP č. 5
8.	Výrub stromov	5.9.2022	Oznámenie č. 8	SO 08-31-51	Doplnenie PD výrubu a odlesnenia vrátane Výkaz Výmer		Nárok č. 6, CP č. 1
9.	Predloženie podrobného časového Harmonogramu prác	28.9.2022	Oznámenie č. 9	Celá stavba	Predloženie HMG na 29 mesiacov	Odpoveď 10.10.2022	
10.	Demonstrácia základov trakčného vedenia	18.10.2022	Oznámenie č. 9 - odpoveď Zhotoviteľa			Odpoveď 20.10.2022	
11.	Odstranenie konštrukcie (dočasné protichodné zabezpečenie svalu)	16.11.2022	Oznámenie č. 10	SO 08-35-01	Vydanie pokynu do 17.12.2022 na vypracovanie zmenovej PD a VV	18.11.2022-Žiadosť na AD	29.11.2023-Stanovisko AD
12.	Realizácia trvalej žetovnicovej steny v zariadení	21.11.2022	Oznámenie č. 11	SO 08-33-21, SO 08-38-17	Žiadosť o doplnenie PD - odstránenie konštrukcie. Vydanie Pokynu do 05.12.2022	30.11.2022-Odpoveď SD	
13.	Nesúlad tlačenej verzie PD s el. verzou	22.11.2022	Oznámenie č. 12	SO 08-38-21	Realizácia trvalej žetovnicovej steny. Vydanie Pokynu do 28.11.2022	26.10.2022-Žiadosť o stanovisko AD 4.11.2022-Súhlas SD 9.11.2022-Opravné stanovisko SD 30.11.2022-Odpoveď Zhotoviteľa	28.10.2022-Stanovisko AD Súvisí s Nárokom č. 12
14.	Vydanie k žiadosti o stanovisko k PD -plynárské zariadenia	28.11.2022	Oznámenie č. 13	Celá stavba	Zhotoviteľ žiada o vydanie správnej PD v papierovej forme. Vydanie Pokynu do 02.12.2022	Súvisí s Nárokom č. 13 30.11.2022-Žiadosť na ŽSR	
15.	Vydanie k žiadosti o stanovisko k PD -SEVAK	19.12.2022	Oznámenie č. 14	SO 08-38-09, SO 08-33-17	Plynárské zariadenie v kolísi s SO 08-33-17, SO 08-38-09, vydanie Pokynu do 01.08.2023	22.12.2022-Žiadosť na AD 19.1.2023 Odstúpenie stanoviska AD Zhotoviteľovi	18.1.2023 - Stanovisko AD Súvisí s Nárokom č. 24 Zápis z KO č. 4
16.	Oznámenie o dočasnom zbere pozemkov nad rámec pozemkov v PD	19.12.2022	Oznámenie č. 15	SO 08-33-02	Absencia riešenia prekážky/ochrany kanalizačného potrubia DN 500. Vydanie Pokynu do 01.02.2023	22.12.2022 Žiadosť na AD 19.1.2023 Odstúpenie stanoviska AD Zhotoviteľovi	16.1.2023 - Stanovisko AD
17.	Vydanie k žiadosti o stanovisko k PD -SEVAK	20.12.2022	Oznámenie č. 16	Celá stavba	Dočasný záber pozemku v obci Svrčinovec	18.1.2023 Odpoveď Zhotoviteľa	
18.	Existujúca vodná sieť neexistujúho správcu	19.12.2022	Oznámenie č. 17	SO 08-38-09	Existencia mŕňierskych sietí s SO 08-38-09, s ktorými nie je uvažované v PD, vydanie Pokynu do 01.08.2023	22.12.2022 Žiadosť na AD 19.1.2023 Odstúpenie stanoviska AD Zhotoviteľovi	18.1.2023 - Stanovisko AD Súvisí s Nárokom č. 26 Zápis z KO č. 2
19.	Armatura veľkopriemerných píl	10.1.2023	Oznámenie č. 18	SO 08-38-09, SO 08-33-17	Existencia inžinierskych sietí, s ktorými nie je uvažované v PD, dodanie PD do 1.8.2023	12.1.2023 Žiadosť na AD 24.1.2023 Odstúpenie stanoviska AD Zhotoviteľovi	18.1.2023 - Stanovisko AD Zápis z KO č. 2 Súvisí s Nárokom č. 28
20.	Poloha koľaje č. 1 a č. 2 v mieste napájania koľaj	12.1.2023	Oznámenie č. 19	SO 08-33-17	Nezrovnalosti v PD - žiadosť o doplnenie PD v súvislosti s armatúrou veľkopriem. píl	12.1.2023 Žiadosť na AD 19.1.2023 Odstúpenie stanoviska AD Zhotoviteľovi	Stanovisko AD 18.1.2023 Súvisí s Nárokom č. 19
21.	Zriadenie dočasného staveniskového priestrešia	1.2.2023	Oznámenie č. 20	SO 08-32-01	Žiadosť o doplnenie PD a VV-nesúlad medzi polohou koľaje. Vydanie Pokynu do 25.4.2023	13.2.2023 Odpoveď Zhotoviteľa 27.2.2023 Žiadosť na ŽSR	Súvisí s Nárokom č. 20
		24.2.2023	Oznámenie č. 20 - doplnenie				
		3.2.2023	Oznámenie č. 21	SO 08-33-14	Vydanie Pokynu na realizáciu dočasného staveniskového priestrešia		Zápis z KP, KO
		15.2.2023	Oznámenie č. 21 - doplnenie súhlasu MD SR				
		3.2.2023	Oznámenie č. 22			13.2.2023 Odpoveď Zhotoviteľa 1.3.2023 Žiadosť na ŽSR	Súvisí s Nárokom č. 22

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

22.	Doplnenie PD	28.2.2023	Oznámenie č. 22 - predloženie geodetického protokolu	SO 08-38-09, SO 08-34-01	Vybudovanie dočasného aj trvalého VO, kľúčia v stavebných objektoch trakčného vedenia a profilujúceho steny. Vydanie Pokynu resp. výkresu do 1.6.2023	25.7.2023 Odpustenie PD (08-34-01) Zhotoviteľovi 2.8.2023 - Aktualizácia výkresu-odstupeneé Zhotoviteľovi	24.7.2023 - AD odpustil PD
23.	Nový výkres výsledky dynamických penetračných sond	15.3.2023	Oznámenie č. 23 - aktualizovanie odlišia	SO 08-33-06	Vydanie Pokynu/výkresu na zmenu realizácie zaradenia žetónov, najneskôr do 29.3.2023	21.3.2023 Odpoveď Zhotoviteľovi	Zápis z KP č. 7 Súvisí s Nárokom č. 23
24.	Zmena technológie zhotovenia podzemnej steny SO 08-33-10 na základe doplnkového IGP	17.3.2023 23.3.2023	Oznámenie č. 24 Oznámenie č. 24 - doplnenie vyjadrenia	SO 08-33-10	Vydanie Pokynu na zmenu technológie podzemných stien z pôvodnej monolitické na pílčový kotvený stenu z dôvodu dopravovania PD, najneskôr do 28.3.2023	20.3.2023 Žiadosť na Zhotoviteľa 27.3.2023 Žiadosť na AD 13.4.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	4.4.2023 - Stanovisko AD Súvisí s Ponukou č. 9 Pokyn SO č. 11 Súvisí s Nárokom č. 25
25.	Čierne skládky	17.3.2023	Oznámenie č. 25	SO 08-33-06, SO 08-32-02.A	Vydanie Pokynu/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním čiernej skládky, čo najskôr	23.3.2023 Oznámenie na ŽSR	Súvisí s Nárokom č. 25
26.	Pyrotechnický prískaum	21.3.2023	Oznámenie č. 26	SO 08-33-14, SO 08-33-21, SO 08-33-06, SO 08-33-10	Vydanie Pokynu na vykonanie pyrotechnického prískaumu, najneskôr do 3.4.2023	23.3.2023 - Žiadosť o stanovisko AD 25.4.2023 - Predch. súhlas na ŽSR 8.6.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi-zamietnutie	4.4.2023 - Stanovisko AD 26.2023 - Neuhlas Objeďnávateľa
27.	Čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu	24.3.2023	Oznámenie č. 27	SO 08-32-02	Vydanie Pokynu/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním nebezpečného odpadu, čo najskôr	27.3.2023 - Predch. súhlas na ŽSR	Súvisí s Nárokom č. 27 19.4.2023 - Súhlas Objeďnávateľa
28.	Úprava POV vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti	24.3.2023 20.4.2023 22.5.2023	Oznámenie č. 28 Oznámenie č. 28 - doplnenie Oznámenie č. 28 - doplnenie II.	celá stavba	Vydanie Pokynu/výkresu na úpravu POV a PD, najneskôr do 4.4.2023 (Predpokladaný plán výluk podľa pôvodného POV nie je možné dodržať)	29.3.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 26.4.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 24.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	Súvisí s Nárokom č. 1 Nárokom č. 2 Oznámením č. 21 Oznámením č. 24 Oznámením č. 25
29.	Určenie zemníka SO 08-38-10, doplnenie VV SO 08-35-01.A, SO 08-35-01.B	3.4.2023 28.4.2023	Oznámenie č. 29 Oznámenie č. 29 - doplnenie	SO 08-38-10, SO 08-35-01.A, SO 08-35-01.B	1. Vydanie Pokynu/výkresu, ktorým sa určí vhodný zemník v rámci stavby. 2. Vydanie Pokynu/výkresu, ktorým sa doplní VV o chýbajúcu položku "poplatok za skládku zeminy", najneskôr do 15.4.2023 Predloženie rozboru položky 12220403, predlož. zemníka na základe kt. Zhotoviteľ pripravil CP Doplnenie - posúdenie výkopovej zeminy zo SO 08-38-10 ako zemníka pre zeminu do násypu pre SO 08-38-10	13.4.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 5.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	
30.	Recyklácia materiálu kolbového kľáka	18.5.2023 4.4.2023 27.4.2023	Oznámenie č. 29 - doplnenie II. Oznámenie č. 30 Oznámenie č. 30 - doplnenie kategórie odpadu na žiadosť SO	SO 08-32-03.A, SO 08-32-03.B	Vydanie Pokynu na recykláciu materiálu kolbového kľáka	23.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 21.4.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	Súvisí s Ponukou č. 6
31.	Položka 6 kv kábla	14.4.2023	Oznámenie č. 31	SO 08-35-21.A, SO 08-35-21.B	Nesúlad polohy kábla vedenia 6KV - Zhotoviteľ z dôvodu plánovanej obj. mat. žiada SO o vydanie Pokynu, kt. sa aktualizuje PD, VV a Tabuľka káblov z kt. bude zrejma dĺžka kábla 6KV pre jednotlivé úseky medzi TS.	18.4.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	Súvisí s Nárokom č. 31
32.	Káblková trasa v osi nových trakčných stožiarov	17.4.2023 26.4.2023	Oznámenie č. 32 Odpoveď Zhotoviteľa na list SO č. 147/2023/IB/IBO	08-35-01	Žiadosť o vydanie Pokynu, ktorým sa určí ďalší postup prác - káblková trasa v osi nových trakčných stožiarov	21.4.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 3.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	Súvisí s Nárokom č. 32
33.	Návážka zeminy v SO 08-38-01	24.4.2023	Oznámenie č. 33	08-38-01	Navážka práce spojené s navážaním zeminy a plochy svaňovania kvôli rozopre v hodnotách namieranej nadmorskej výšky. Žiadosť o vydanie Pokynu kt. sa doplní PD a VV.	5.5.2023 - Žiadosť na AD 5.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 27.9.2023 - Odpustenie PD Zhotoviteľovi	Súvisí s Nárokom č. 33 26.9.2023-Odpustenie PD od AD
34.	Zhotovenie larsenových stien pre zaistenie výkopov svaňových kľád	25.4.2023 5.5.2023	Oznámenie č. 34 Oznámenie č. 34 - odpoveď Zhotoviteľa na list SO č. 166/2023/IB/IBN	08-33-17	Nesúlad medzi techn. správou a výkresovú časťou PD. Vydanie Pokynu do 2.5.2023	27.4.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 11.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	Súvisí s Nárokom č. 34
35.	Výber riešenia varianty pre zakladania PHS	28.4.2023	Oznámenie č. 35	08-34-01.A, 08-34-01.B	Výber riešenia technológie založenia protihlukovej steny	4.5.2023 - Žiadosť na AD 11.5.2023 - Predch. súhlas na ŽSR 29.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 13.6.2023 - Odpustenie stanoviska AD Zhotoviteľovi	8.6.2023 - Stanovisko AD 22.5.2023 - Súhlas Objeďnávateľa
36.	Čierne skládky nebezpečného odpadu - azbestu	5.5.2023 30.5.2023	Oznámenie č. 36 Oznámenie č. 36	SO 08-37-03, SO 08-38-01 SO 08-38-01	Vydanie Pokynu/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním skládok nebezpečného odpadu, do 11.5.2023 Rozčistenie Oznámenia č. 36 - SO 08-38-01. Žiadosť o vydanie Pokynu/výkresu k	11.5.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi 6.6.2023 - Predch. súhlas na ŽSR	Súvisí s Nárokom č. 35

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

	odpadu zbezpečenosti SO 08-38-01	30.5.2023	Oznámenie č. 37			ďalšiemu postupu s odstraňovaním skládok nebezpečného odpadu V dôsledku zmeny súdnej mapy je novým registrovým súdom Zhotoviteľ Mestský súd Bratislava III., od 1.6.2023	9.8.2023 - mail ŽSR-Súhlas	
37.	Zmena súdnej mapy							
38.	Čierna skládka nebezpečného odpadu zbezpečenosti SO 08-37-03	31.5.2023	Oznámenie č. 38	SO 08-37-03		Rozčlenenie Oznámenia č. 36 - SO 08-37-03, žiadosť o vydanie Pokynu/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním skládok nebezpečného odpadu	6.6.2023 - Predch. súhlas na ŽSR 9.8.2023 - mail ŽSR-Súhlas	Súvisí s Nárokom č. 38
39.	Čierna skládka SO 08-32-02.A	26.5.2023	Oznámenie č. 39	SO 08-32-02.A		Rozčlenenie z Nároku č. 25 - SO 08-32-02.A - žiadosť o vydanie Pokynu/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním skládok odpadu	6.6.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	
40.	Kolíska OP1 s kanalizáciou DN500	10.7.2023	Oznámenie č. 40	SO 08-33-02		Poloha existujúcej kanalizácie DN-500 je v kolízii s oporou č. 1 mostu SO 08-33-02, žiadosť o vydanie Pokynu do 18.7.2023	11.7.2023 - Žiadosť na ŽSR	Súvisí s Nárokom č. 29
42.	Nevhodné geologické podmienky	20.7.2023	Oznámenie č. 42	SO 08-37-02, SO 08-37-05, SO 08-37-04, SO 08-37-01		Žiadosť o vydanie Pokynu k spôsobu realizácie ocelej chráničky v SO 08-37-02 a SO 08- 37-05, do 27.7.2023	24.7.2023 - Žiadosť na Reming	31.7.2023 - Stanovisko AD Súvisí s Nárokom č. 36
43.	Nedodanie zmluvy o preložke plynárenského zariadenia	20.7.2023	Oznámenie č. 43	SO 08-37-04, SO 08-37-01		Upozornenie na absenciu Zmluvy o preložke plyn. zariadenia - nemožno realizovať práce na daných SO	24.7.2023 - Žiadosť na ŽSR	Súvisí s Nárokom č. 37
44.	Kolíska trakčných podpier	25.7.2023	Oznámenie č. 44	SO 08-34-01		Žiadosť o vydanie Pokynu do 28.7.2023 - naviac práce z dôvodu kolízie trakčných podpier	25.7.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi	24.7.2023 - Návrh riešenia AD Súvisí s Nárokom č. 39
45.	Nepriaznivé geologické podmienky	28.7.2023	Oznámenie č. 45	SO 08-33-06		Nepriaznivé geol. podmienky na základe zrealizovaných sond dynamická penetrácia		Súvisí s Nárokom č. 23 Nárokom č. 41
46.	Pokusné zariadenie štetovnic	18.8.2023	Oznámenie č. 46	08-33-01		Žiadosť o vydanie Pokynu k ďalšiemu stavbe. Postupu - nemožnosť zariadiť štetovnice do dĺžky 12m	20.7.2023 Odpoveď SO na upozornenie Zhotoviteľa č. 2 23.8.2023 - Odpoveď Zhotoviteľovi (let 388 na ŽSR sa napokon neodsúhlasil)	19.7.2023 Upozornenie Zhotoviteľa č. 2 Súvisí s Nárokom č. 40
47.	Pokusné zariadenie štetovnic	25.8.2023	Oznámenie č. 47	08-32-66		Projektované štetovnice 9m a 12m nebude možné realizovať v zmysle DIS ich zariadením bez ďalších technických prác		Súvisí s Nárokom č. 42
48.	Kolíska jestrojujúceho telekomunikačného stĺpu s realizáciou dočasného napojenia kolíaje č. 1	7.9.2023	Oznámenie č. 48	08-32-01, 08-36-02.A		Žiadosť o vydanie Pokynu do 27.10.2023, ktorým sa určí ďalší postup prác z dôvodu kolízie telekom. stĺpu s provizórnym napojením kolíaje č. 1	18.9.2023 - Žiadosť na Reming	
49.	Pokusné zariadenie štetovnic	8.9.2023	Oznámenie č. 49	08-33-04		Žiadosť o vydanie Pokynu k ďalšiemu postupu prác - nemožnosť zariadiť štetovnice dĺžky 6-12 m	20.7.2023 Odpoveď SO na upozornenie Zhotoviteľa č. 2 12.9.2023 - Odpoveď SO	19.7.2023 Upozornenie Zhotoviteľa č. 2 Súvisí s Nárokom č. 43
50.	Uskladnenie ocelej konštrukcie	18.9.2023	Oznámenie č. 50	08-33-06		Zhotoviteľ upozorňuje, že nie je možné zahájiť práce na montáži ocelej konštrukcie SO 08-33-06 podľa pôvodného HMG prác	26.9.2023 - Odpoveď SO	
51.	Pokusné zariadenie štetovnic	28.9.2023	Oznámenie č. 51	08-32-52		Projektované štetovnice 9m a 12m nebude možné realizovať v zmysle DIS ich zariadením bez ďalších technických prác		

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

17. Zoznam Nárokov Zhotoviteľa

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanoviško AD		Súhlas ZSR		Zl	Súhlas SD	
						Dodatočná platba - predbežne [€]	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	požiadané	doručené	požiadané	doručené		požiadané	doručené
1	Vyššia moc	11.4.2022	Oznámenie o Nároku č. 1		Navýšenie cien-energií, materiálov a predĺženie čakacej lehoty na dodku materiálov kvôli vojnovému konfliktu Rusko-Ukrajina	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	Zhotoviteľ nevie vyčísliť							
		29.6.2022	Priebežný Nárok č. 1											
		18.7.2022	Odpoveď Objednávateľa na Nárok č. 1											
		26.7.2022	Priebežný Nárok č. 1 II.											
		22.8.2022	Priebežný Nárok č. 1 III.											
		20.9.2022	Priebežný Nárok č. 1 IV.											
		27.9.2022	Priebežný Nárok č. 1 V.											
		29.9.2022	Odpoveď SD											
		25.10.2022	Priebežný Nárok č. 1 VI.											
		25.10.2022	Odpoveď SD VI.											
		22.11.2022	Priebežný Nárok č. 1 VII.											
		29.11.2022	Odpoveď SD VII.											
		20.12.2022	Priebežný Nárok č. 1 VIII.											
		22.12.2022	Odpoveď SD VIII.											
		16.1.2023	Priebežný Nárok č. 1 IX.											
		17.1.2023	Odpoveď SD IX.											
		13.2.2023	Priebežný Nárok č. 1 X.											
		16.2.2023	Odpoveď SD X.											
		13.3.2023	Priebežný Nárok č. 1 XI.											
		15.3.2023	Odpoveď SD XI.											
		5.4.2023	Priebežný Nárok č. 1 XII.											
		5.4.2023	Odpoveď SD XII.											
		3.5.2023	Priebežný Nárok č. 1 XIII.											
		4.5.2023	Odpoveď SD XIII.											
		31.5.2023	Priebežný Nárok č. 1 XIV.											
		31.5.2023	Odpoveď SD XIV.											
		28.6.2023	Priebežný Nárok č. 1 XV.											
		30.6.2023	Odpoveď SD XV.											
		26.7.2023	Priebežný Nárok č. 1 XVI.											
		27.7.2023	Odpoveď SD XVI.											
		22.8.2023	Priebežný Nárok č. 1 XVII.											
		24.8.2023	Odpoveď SD XVII.											
		19.9.2023	Priebežný Nárok č. 1 XVIII.											
		20.9.2023	Odpoveď SD XVIII.											
		2.6.2022	Oznámenie Objednávateľa											
		15.6.2022	Nárok č. 2											
		12.7.2022	Priebežný Nárok č. 2											
		5.8.2022	Priebežný Nárok č. 2 II.											
		25.8.2022	Priebežný Nárok č. 2 III.											
		15.8.2022	Odpoveď Objednávateľa											
		21.6.2022	email Objednávateľa											
		15.7.2022	List Objednávateľa											
		2.8.2023	email Objednávateľa											
		11.8.2023	List Objednávateľa											
		20.9.2022	Priebežný Nárok č. 2 IV.											
		18.10.2022	Priebežný Nárok č. 2 V.											
		20.10.2022	Odpoveď SD V.											
		23.11.2022	Konečný Nárok č. 2 - časť I. POV	08-32-01-B										
		15.11.2022	Priebežný Nárok č. 2 VI.											
		28.11.2022	Odpoveď SD Doplňujúce POV etapa 0											
		29.11.2022	Odpoveď SD VI.											
		13.12.2022	Priebežný Nárok č. 2 - Predĺženie lehoty výstavby VII.											
		14.12.2022	Odpoveď SD VII.											
		10.1.2023	Priebežný Nárok č. 2 VIII.											
		12.1.2023	Odpoveď SD VIII.											

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

[illegible]

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Název Nároku	Dátum	Název	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD		Súhlas ŽSR		ZL	Súhlas SD	
						Dodatočná platba - predbežne [€]	Predbežná lehota výstavby - predbežne [dni]	požiadané	doručené	požiadané	doručené			
4	Zvýšenie zákonných poplatkov	29.7.2022	Nárok č. 4		Novelizované nariadenie vlády - výška poplatkov za uloženie odpadov	88 027,62								
		22.8.2022	Priebežný Nárok č. 4											
		20.9.2022	Priebežný Nárok č. 4 II.											
		18.10.2022	Priebežný Nárok č. 4 III.											
		20.10.2022	Odpoveď SD III.											
		14.11.2022	Priebežný nárok č. 4 IV.											
		29.11.2022	Odpoveď SD IV.											
		12.12.2022	Priebežný Nárok č. 4 V.											
		12.12.2022	Odpoveď SD V.											
		9.1.2023	Priebežný Nárok č. 4 VI.											
		12.1.2023	Odpoveď SD VI.											
		6.2.2023	Priebežný Nárok č. 4 VII.											
		14.2.2023	Odpoveď SD VII.											
		6.3.2023	Priebežný Nárok č. 4 VIII.											
		9.3.2023	Odpoveď SD VIII.											
		6.3.2023	Stanovisko Objednávateľa											
		15.3.2023	Stanovisko Zhotoviteľa											
		3.4.2023	Priebežný Nárok č. 4 IX.											
		13.4.2023	Odpoveď SD IX.											
		28.4.2023	Priebežný Nárok č. 4 X.											
		26.5.2023	Priebežný Nárok č. 4 XI.											
		1.6.2023	Odpoveď SD X, XI.											
		5.6.2023	Vyjadrenie Objednávateľa											
		23.6.2023	Priebežný Nárok č. 4 XII.											
		27.6.2023	Odpoveď SD XII.											
		20.7.2023	Priebežný Nárok č. 4 XIII.											
		21.7.2023	Odpoveď SD XIII.											
		17.8.2023	Priebežný Nárok č. 4 XIV.											
		18.8.2023	Odpoveď SD XIV.											
		14.9.2023	Priebežný Nárok č. 4 XV.											
		18.9.2023	Odpoveď SD XIV.											
5	Alternatívna komunikácia (do osady Kuloč) a diagnostika mostu cez Šlahorov potok - Srčňovec	1.8.2022	Nárok č. 5		Časť I.) Problematika diagnostiky mostu cez Šlahorov potok Časť II.) Problematika alternatívnej komunikácie do osady Kuloč	38 450	Zhotoviteľ nevie vyčísliť						Pokyn SD č. 5 20.1.2023 https://bunginfram.com/data	
		24.8.2022	Priebežný Nárok č. 5											
		19.8.2022	Odpoveď Objednávateľa											
		20.9.2022	Priebežný Nárok č. 5 II.											
		14.10.2022	Priebežný Nárok č. 5 III. (dĺžkový)											
		19.10.2022	Odpoveď SD III.											
		20.10.2022	Nárok č. 5	08-33-17										
		20.10.2022	Odpoveď SD na Nárok č. 5	33-21										
		28.10.2022	Priebežný Nárok č. 5	08-32-38-10										
		15.11.2022	Priebežný Nárok č. 5 - predloženie podrobnej etapy. 01	08-32-02										
		11.11.2022	Odpoveď SD - zamietnuté	08-32-03										
		11.11.2022	Odpoveď SD - zamietnuté	08-38-09										
		21.11.2022	Odpoveď SD - zamietnuté											
		20.1.2023	Pokyn SD č. 5											
		14.2.2023	Náklady na zabezpečenie inž. činnosti a vypracovanie PO do osady Kuloč											
		16.2.2023	Ozvámenie SD Objednávateľovi											
		3.10.2022	Nárok č. 6									1	Pokyn SD č. 1 5.10.2022 https://bunginfram.com/data	
		5.10.2022	Pokyn SD č. 1											
		31.10.2022	Priebežný Nárok č. 6											
		14.11.2022	Priebežný Nárok č. 6 - doplnenie											
		25.11.2022	Vyjadrenie SD k Nároku č. 6 - doplnenie											
		30.11.2022	Pokyn SD č. 3											
		01.12.2022	Odpoveď k vyjadreniu SD k Nároku č. 6 - doplnenie										Pokyn SD č. 3 30.11.2022 https://bunginfram.com/data	
		12.12.2022	Priebežný Nárok č. 6 Výrub stromov - II.											

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD		Súhlas ŽSR		Zl	Súhlas SD
6	Výrub stromov	14.12.2022	Polyn SD č. 4	SO 08-31-51	Dendrologický prieskum medzujúci sa so špecifickou, naviac práce v súvislosti s výrubom	717 143,53	70			požiadané	doručené		Polyn SD č. 4 14.12.2022 https://bunginfram.sk
		19.12.2022	Odpoveď SD II.										
		9.1.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov III.										
		12.1.2023	Odpoveď SD III.										
		6.2.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov IV.										
		14.2.2023	Odpoveď SD IV.										
		6.3.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov V.										
		7.3.2023	Odpoveď SD V.										
		3.4.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov VI.										
		5.4.2023	Odpoveď SD VI.										
		28.4.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov VII.										
		3.5.2023	Odpoveď SD VII.										
		26.5.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov VIII.										
		29.5.2023	Odpoveď SD VIII.										
		23.6.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov IX.										
		26.6.2023	Odpoveď SD IX.										
		20.7.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov X.										
		21.7.2023	Odpoveď SD X.										
		17.8.2023	Priebežný Nárok č. 6 - Výrub stromov XI.										
		21.8.2023	Odpoveď SD XI.										
		14.9.2023	Konečný Nárok č. 6 - Výrub stromov										
		19.9.2023	Odpoveď SD na Konečný Nárok č. 6										
		30.9.2022	Oznámenie o Nároku č. 7										
7	Diagnostika mosta ponad Šlahorov potok - Svrčinovec	10.10.2022	Odpoveď SD na Oznámenie o Nároku č. 7	SO 08-33-17 SO 08-33-21 SO 08-38-10	Stav cestného mosta ponad Šlahorov potok je nevyhovujúci (potvrdené záverečnou správou z diagnostiky)	Zhotoviteľ nevie vyšliť	Zhotoviteľ nevie vyšliť						
8	Priečerpávané množstvo na polodĺžkach štetovnice	22.11.2022	Nárok č. 8 - Priečerpávané množstvo na polodĺžkach štetovnice		Priečerpávané množstvo na polodĺžkach 134421200P, 237941111	4 387,83	Žiadne						
		28.11.2022	Odpoveď SD na Nárok č. 8										
		20.12.2022	Priebežný Nárok č. 8										
		22.12.2022	Odpoveď SD na Priebežný nárok Nárok č. 8										
		17.1.2023	Priebežný Nárok č. 8 II.										
		19.1.2023	Odpoveď SD II.										
		14.2.2023	Priebežný Nárok č. 8 III.										
		16.2.2023	Odpoveď SD III.										
		14.3.2023	Priebežný Nárok č. 8 IV.										
		15.3.2023	Odpoveď SD IV.										
		5.4.2023	Priebežný Nárok č. 8 V.										
		5.4.2023	Odpoveď SD V.										
		3.5.2023	Priebežný Nárok č. 8 VI.										
		4.5.2023	Odpoveď SD VI.										
		31.5.2023	Priebežný Nárok č. 8 VII.										
		1.6.2023	Odpoveď SD VII.										
		28.6.2023	Priebežný Nárok č. 8 VIII.										
		30.6.2023	Odpoveď SD VIII.										
		26.7.2023	Priebežný Nárok č. 8 IX.										
		27.7.2023	Odpoveď SD IX.										
		23.8.2023	Priebežný Nárok č. 8 X.										
		24.8.2023	Odpoveď SD X										
		20.9.2023	Priebežný Nárok č. 8 XI.										
		20.9.2023	Odpoveď SD XI.										
		21.12.2022	Nárok č. 10										
		18.1.2023	Priebežný Nárok č. 10										
		19.1.2023	Odstúpenie stanoviska AD										
		20.1.2023	Odpoveď SD na Nárok a Priebežný Nárok č. 10										
		15.2.2023	Priebežný Nárok č. 10 II.										

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanoviško AD				Súhlas ŽSR		Zl	Súhlas SD
								požiadané	doručené	požiadané	doručené	požiadané	doručené		
10	Demontáž základov TV priebežný Nárok - vyčistenie po ukončení prác	16.2.2023	Odpočet SD II.	SO 05-35-01	množstvo základov TP a chýbajúce svorníky - dodatocné náklady spojené s demontážou základov TP	Zhotoviteľ nevie vyčíslit	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	13.12.2022	22.12.2022	13.1.2023	24.2.2023	https://bunginfra.com/sharepoint.com/sharespoint.com	https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com	1	Súhlas SD 27.2.2023 https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com
		20.2.2023	mail - odpoved na Nárok č. 10												
11.	Odstránenie konštrukcie	15.3.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) II.	SO 08-33-17 SO 08-33-21	Odstránenie konštrukcie časť A) základová páska z betónu železového	Zhotoviteľ nevie vyčíslit	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	13.12.2022	22.12.2022	13.1.2023	24.2.2023	https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com	https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com	1	Súhlas SD 27.2.2023 https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com
		16.1.2023	mail - odpoved na Nárok č. 11 (časť B.) II.												
		19.1.2023	Odpočet SD časť B.) II.												
		13.2.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) III.												
		14.2.2023	Odpočet SD časť B.) III.												
		27.2.2023	Súhlas SD s Konečným Nárokom č. 11 - Odstránenie konštrukcie časť A) základová páska z betónu železového												
		13.3.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) IV.												
		15.3.2023	Odpočet SD časť B.) IV.												
		5.4.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) V.												
		5.4.2023	Odpočet SD časť B.) V.												
		3.5.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) VI.												
		4.5.2023	Odpočet SD časť B.) VI.												
		31.5.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) VII.												
		31.5.2023	Odpočet SD časť B.) VII.												
12.	Realizácia žetovnicovej steny v	28.6.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) VIII.	SO 08-33-21	Realizácia žetovnicovej steny v	Zhotoviteľ nevie vyčíslit	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	13.12.2022	22.12.2022	13.1.2023	24.2.2023	https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com	https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com	1	Súhlas SD 27.2.2023 https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com
		30.6.2023	Odpočet SD časť B.) VIII.												
		26.7.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) IX.												
		27.7.2023	Odpočet SD časť B.) IX.												
		23.8.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) X.												
		25.8.2023	Odpočet SD časť B.) X.												
		20.9.2023	Priebežný Nárok č. 11 (časť B.) XI.												
		20.9.2023	Odpočet SD XI.												
12.	Realizácia žetovnicovej steny v	8.12.2022	Konečný Nárok č. 12	SO 08-33-21	Realizácia žetovnicovej steny v	Zhotoviteľ nevie vyčíslit	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	13.12.2022	22.12.2022	13.1.2023	24.2.2023	https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com	https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com	1	Súhlas SD 27.2.2023 https://bunginfra.com/sharespoint.com/sharespoint.com

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD				Súhlas ŽSR		Zl	Súhlas SD	
								požadované	doručené	požadované	doručené	požadované	doručené			
13.	Nesúlad tlačenej verzie Projektovej dokumentácie s elektronickou verzou	21.12.2022	Nárok č. 13 - Nesúlad tlačenej verzie PD s elektronickou verzou	celá stavba	Dodanie platnej a správnej PD na celú stavbu	7 543,50	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	12.1.2023	18.1.2023							
14.	Zmena polohy bodov výťahovej siete	17.3.2023	Nárok č. 14 - Zmena polohy bodov výťahovej siete	SO 08-35-01	Žiadosť o vydanie pokynu na vyhotovenie projektu preloženia a vyhotovenia náhradných bodov výťahovej siete	7 543,50	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	15.3.2023	20.3.2023	27.3.2023	19.4.2023					
15.	Svalový pohyb v území SO 08-33-06	21.4.2023	Nárok č. 15 - svalový pohyb v území	SO 08-33-06	Žiadosť o vydanie Pokynu na vykonanie doplnkového GP	18 771,01	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	21.3.2023	4.4.2023	12.4.2023	19.4.2023					
15.	Svalový pohyb v území SO 08-33-06	27.6.2023	Nárok č. 15 - svalový pohyb v území	SO 08-33-06	Žiadosť o vydanie Pokynu na vykonanie doplnkového GP	13 863,09	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	11.7.2023	18.8.2023	11.7.2023	18.8.2023					

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD		Súhlas ŽSR		Zl	Súhlas SD
						Dodatočná platba - predbežne [€]	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	požiadané	doručené	požiadané	doručené		
16.	Mimoriadna udalosť - posun TK 1 v km 286,200-286,250	21.8.2023	Súhlas SD s konečným Nárokom č. 15										Súhlas SD 21.8.2023
		11.4.2023	Nárok č. 16 - mimoriadna udalosť posun TK 1										
		5.5.2023	Odpoveď SD na Nárok č. 16										
		9.5.2023	Priebežný Nárok č. 16 - mimoriadna udalosť posun TK 1	08-33-17	Narušenie geometr. polohy koláje v priestore larsenovej steny - rakiady spojené s odstránením závaly	94 317,00							
		18.5.2023	Odpoveď SD na Priebežný Nárok č. 16										
		6.6.2023	Priebežný Nárok č. 16 I.										
		12.6.2023	Odpoveď SD I.										
		4.7.2023	Konečný Nárok č. 16										
		26.4.2023	Nárok č. 17 - jadrové vŕtanie pílôt										
		5.5.2023	Odpoveď SD na Nárok č. 17										
17.	Jadrové vŕtanie pílôt	24.5.2023	Priebežný Nárok č. 17										
		25.5.2023	Odpoveď SD na Priebežný Nárok č. 17										
		21.6.2023	Priebežný Nárok č. 17 II.										
		23.6.2023	Odpoveď SD II.										
		19.7.2023	Priebežný Nárok č. 17 III.	08-33-17	Naviac práce súvisiace s jadrovými vŕtmi	9 120,05							
		20.7.2023	Odpoveď SD III.										
		16.8.2023	Priebežný Nárok č. 17 IV.										
		18.8.2023	Odpoveď SD IV.										
		13.9.2023	Priebežný Nárok č. 17 V.										
		14.9.2023	Odpoveď SD V.										
19.	Amatúra veľkopriemerových pílôt priemer 900mm a 1200 mm	9.2.2023	Oznámenie o Nároku č. 19										
		14.2.2023	Odpoveď SD na Oznámenie o Nároku č. 19										
		23.2.2023	Konečný Nárok č. 19										
		24.2.2023	Odpoveď SD na Konečný Nárok č. 19										
		23.3.2023	Priebežný Nárok č. 19										
		24.3.2023	Odpoveď SD na Priebežný Nárok č. 19										
		20.4.2023	Priebežný Nárok č. 19 II.										
		21.4.2023	Odpoveď SD II.										
		18.5.2023	Priebežný Nárok č. 19 III.										
		22.5.2023	Odpoveď SD III.										
		15.6.2023	Priebežný Nárok č. 19 IV.	08-33-17	Ochýľajúce množstvo položky 224861114 (Výstup pílôt betónovaných do zeme s vytiahnutím palnice, z ocele 10 505)	59 325,63							
		16.6.2023	Odpoveď SD IV.										
		13.7.2023	Priebežný Nárok č. 19 V.										
		14.7.2023	Odpoveď SD V.										
		10.8.2023	Priebežný Nárok č. 19 VI.										
15.8.2023	Odpoveď SD VI.												
7.9.2023	Priebežný Nárok č. 19 VII.												
8.9.2023	Odpoveď SD VII.												
19.9.2023	Konečný Nárok č. 19												
20.	Poloha koláje č. 1 a č. 2 v mieste napájania koláji (dočasné napojenie na starý stav koláje č. 2)	25.4.2023	Nárok č. 20										
		23.5.2023	Priebežný Nárok č. 20										
		20.6.2023	Priebežný Nárok č. 20 II.										
		10.7.2023	Súhlas SD s Nárokom č. 20										
		18.7.2023	Priebežný Nárok č. 20 III.										
		19.7.2023	Odpoveď SD III.										
		24.7.2023	Konečný Nárok č. 20										

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

[illegible]

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD		Súhlas ŽSR		Zl	Súhlas SD									
						Dodatková platba - predbežne [€]	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	požiadané	doručené	požiadané	doručené											
25.	Čierna skládka SO 08-33-06	26.5.2023	Priebežný Nárok č. 25 - čierna skládka 33-06	08-33-06	Rozlíšenie Nároku č. 25 - SO 08-33-06 - Žiadosť o vydanie Pokynu na odstránenie čiernych skládok na území daných SO, náklady spojené s ich odstránením	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	732 072,28						https://bunginfram.sk/sharepoint.com/site Pokyn SD č. 13 21.6.2023									
		6.6.2023	Odpoveď SD na Priebežný Nárok č. 25																			
		21.6.2023	Pokyn SD č. 13																			
		23.6.2023	Priebežný Nárok č. 25 II.																			
		27.6.2023	Odpoveď SD II.																			
		20.7.2023	Priebežný Nárok č. 25 III.																			
26.	Vydanie k žiadosti o stanovisko k PD - SEVAK, a.s.	21.7.2023	Odpoveď SD III.																			
		28.7.2023	Konečný Nárok č. 25 - čierna skládka SO 08-33-06																			
		21.8.2023	Súhlas SD s kon. Nárokom 25																			
26.	Vydanie k žiadosti o stanovisko k PD - SEVAK, a.s.	2.8.2023	Onámenie o Nároku č. 26 - Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k PD - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	08-38-09	Existencia inžinierskych sietí v SO 08-38-09, s ktorými nie je uvažované v PD	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	731 782,40						https://bunginfram.sk/sharepoint.com/site Súhlas SD 21.8.2023									
		4.8.2023	Odpoveď SD																			
		17.8.2023	Nárok č. 26																			
		18.8.2023	Odpoveď SD																			
		14.9.2023	Priebežný Nárok č. 26																			
		19.9.2023	Odpoveď SD																			
		20.4.2023	Onámenie o Nároku č. 27 - čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu											08-32-02	Zhotoviteľ žiada vydanie Pokynu/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním skládok nebezpečného odpadu - azbestu	Zhotoviteľ nevie vyčísliť	10 000,00					
		5.5.2023	Nárok č. 27 - čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu																			
		2.6.2023	Odpoveď SD na Nárok č. 27																			
		2.6.2023	Priebežný Nárok č. 27 - čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu																			
13.6.2023	Odpoveď SD na Priebežný Nárok č. 27																					
27.	Čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu	28.6.2023	Priebežný Nárok č. 27 - II.	08-38-09	Existencia inžinierskych sietí, s ktorými nie je uvažované v PD (súkromný vodovod)	Zhotoviteľ nevie vyčísliť																
		30.6.2023	Odpoveď SD II.																			
		26.7.2023	Priebežný Nárok č. 27 - III.																			
		28.7.2023	Odpoveď SD III.																			
		23.8.2023	Priebežný Nárok č. 27 - IV.																			
		24.8.2023	Odpoveď SD IV.																			
		20.9.2023	Priebežný Nárok č. 27 - V.																			
		20.9.2023	Odpoveď SD V.																			
		2.8.2023	Onámenie o Nároku č. 28 - existujúca sieť nezáisteného správcu											08-38-09	Existencia inžinierskych sietí, s ktorými nie je uvažované v PD (súkromný vodovod)	Zhotoviteľ nevie vyčísliť						
		4.8.2023	Odpoveď SD																			
17.8.2023	Nárok č. 28																					
18.8.2023	Odpoveď SD																					
14.9.2023	Priebežný Nárok č. 28																					
28.	Existujúca sieť nezáisteného správcu	19.9.2023	Odpoveď SD																			
		7.8.2023	Ozrámenie o Nároku č. 29 - kolízia OP1 s kanalizáciou DN500	08-33-02	Zhotoviteľ žiada o pokyn na ďalší postup prác	Zhotoviteľ nevie vyčísliť																
		8.8.2023	Odpoveď SD																			
22.8.2023	Nárok č. 29 - kolízia OP1 s kanalizáciou DN500																					
29.	Kolízia OP1 s kanalizáciou DN500/29																					

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD		Súhlas ŽSR		Súhlas SD	
						Dodatočná platba - predbežne [€]	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	požiadané	doručené	požiadané	doručené	ZL	pokyn SD
31.	Pobíha GKV kábla	7.9.2023	Odpoveď SD	08-35-21.A 08-35-21.B 35-21.B	Zhotoviteľ žiada o vydanie Pokynu, ktorým sa aktualizuje PD v SO 08-35-21 ako aj VV a Tabuľka káblov z ktorej bude zrejma dĺžka kábla GKV pre jednotlivé úseky medzi TS	Zhotoviteľ nevie vyčíslit	Zhotoviteľ nevie vyčíslit	24.5.2023	31.5.2023				
		19.9.2023	Priebežný Nárok č. 29										
		22.9.2023	Odpoveď SD										
32.	Kábová trasa v osi nových trakčných stĺžiarov	15.5.2023	Nárok č. 32 - Kábová trasa v osi nových trakčných stĺžiarov	08-35-01	Dod. náklady spojené s predĺžením káblov z osi budovaných základov TP (žabová kábová trasa - nebola obsiahnutá v PD)	Zhotoviteľ nevie vyčíslit	Zhotoviteľ nevie vyčíslit						
		16.5.2023	Odpoveď SD na Nárok č. 32										
		15.5.2023	Nárok č. 33 - navážka zeminy v SO										
		18.5.2023	Odpoveď SD na Nárok č. 33										
33.	Navážka zeminy v SO 08-38-01	12.6.2023	Priebežný Nárok č. 33 - navážka zeminy v SO 08-38-01	08-38-01	Dodatočné náklady spojené s navýšením množstva zeminy a s navýšením plochy svahovania	58 902,39	Zhotoviteľ nevie vyčíslit						
		16.6.2023	Odpoveď SD na Priebežný Nárok č. 33										
		7.7.2023	Priebežný Nárok č. 33 II.										
		10.7.2023	Odpoveď SD II.										
		2.8.2023	Priebežný Nárok č. 33 III.										
		4.8.2023	Odpoveď SD III.										
		25.8.2023	Priebežný Nárok č. 33 IV.										
		28.8.2023	Odpoveď SD IV.										
		21.9.2023	Priebežný Nárok č. 33 V.										
		22.9.2023	Odpoveď SD V.										
34.	Zhotovenie larsenových stien pre zaistenie výkopov svahových kriedel	23.5.2023	Oznamenie o Nároku č. 34 - Zhotovenie larsenových stien pre zaistenie výkopov svahových kriedel	08-33-17	Nesúlad medzi technickou správou a výkresovou časťou PD - náklady spojené so zhotov. larsen. Stien	36 975,49	Zhotoviteľ nevie vyčíslit						
		26.5.2023	Odpoveď SD										
		6.6.2023	Odpoveď SD										
		7.6.2023	Nárok č. 34 - Zhotovenie larsenových stien pre zaistenie výkopov svahových kriedel										
		14.6.2023	Odpoveď SD na Nárok č. 34										
		4.7.2023	Priebežný Nárok č. 34 - zhotovenie larsenových stien pre zaistenie výkopov svahových kriedel										
		10.7.2023	Odpoveď SD na Priebežný Nárok č. 34										
		1.8.2023	Priebežný Nárok č. 34 II.										
		8.8.2023	Odpoveď SD II.										
		25.8.2023	Priebežný Nárok č. 34 III.										
		28.8.2023	Odpoveď SD III.		Zhotoviteľ žiada vydanie								
		21.9.2023	Priebežný Nárok č. 34 IV.										
		22.9.2023	Odpoveď SD IV.										
		10.8.2023	Nárok č. 35 - čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu										

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD		Súhlas ŽSR		Zl	Súhlas SD
						Dodatočná platba - predbežne [€]	Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dni]	požiadané	doručené	požiadané	doručené		
35.	Čierna skládka nebezpečného odpadu azbestu SO 08-38-01	7.9.2023	Priebežný Nárok č. 35 - čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu	08-38-01	Pokyny/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním skládok nebezpečného odpadu - azbestu	3 000,00					ATA/Dosla/DP%102		Súhlas SD 8.9.2023 https://bunga.sk
		8.9.2023	Súhlas SD s Nárokom č. 35										
		27.9.2023	Konečný Nárok č. 35										
36.	Nevhodné geologické podmienky	17.8.2023	Oznámenie o Nároku č. 36 - nevhodné geologické podmienky		horniny paleogénu v danom SO - žiadosť o vydanie Pokynov k spôsobu realizácie osovovej chrániky	Zhotoviteľ nevie vyčíslit							
		25.8.2023	Nárok č. 36 - nevhodné geologické podmienky	08-37-02									
		5.9.2023	Odpoveď SD	08-37-05									
		21.9.2023	Priebežný Nárok č. 36 - nevhodné geologické podmienky										
		26.9.2023	Odpoveď SD										
37.	Nedodanie zmluvy o preložke plyn. zariadenia	17.8.2023	Oznámenie o Nároku č. 37 - nedodanie zmluvy o preložke plyn. zariadenia		Upozornenie na absenciu Zmluvy o preložke plyn. zariadenia - nemožné realizovať práce na daných SO								
		22.8.2023	Odpoveď SD	08-37-04									
		25.8.2023	Nárok č. 37	08-37-01									
		28.8.2023	Odpoveď SD										
		22.9.2023	Priebežný Nárok č. 37										
		26.9.2023	Odpoveď SD										
38.	Čierna skládka nebezpečného odpadu azbestu SO 08-37-03	28.6.2023	Oznámenie o Nároku č. 38 - čierna skládka nebezpečného odpadu azbestu		Zhotoviteľ žiada vydanie Pokynov/výkresu k ďalšiemu postupu s odstraňovaním skládok nebezpečného odpadu - azbestu	4 183,69	Zhotoviteľ nevie vyčíslit				9.8.2023 mail-žiadosť ŽSR ATA/Dosla/DP%102		Súhlas SD 21.8.2023 https://bunga.sk
		30.6.2023	Odpoveď SD na Oznámenie o Nároku č. 38										
		13.7.2023	Nárok č. 38 - čierna skládka nebezpečného odpadu azbestu	08-37-03									
		14.7.2023	Odpoveď SD										
		10.8.2023	Konečný Nárok č. 38 - čierna skládka nebezpečného odpadu - azbestu SO 08-37-03										
		21.8.2023	Súhlas SD s Konečným Nárokom č. 38										
39.	Kolízia traktových podpier	22.8.2023 11.9.2023	Konečný Nárok č. 39 - kolízia traktových podpier Súhlas SD s Konečným Nárokom č. 39	08-35-01	Naviac práce z dôvodu kolízie traktových podpier	2 544,97		mail 25.7.2023 https://bunga.sk	25.8.2023 https://bunga.sk	11.9.2023 https://bunga.sk			
40.	Pokusné zarážanie štetovnic 08-33-01	22.8.2023 5.9.2023	Konečný Nárok č. 40 - pokusné zarážanie štetovnic Odpoveď SD	08-33-01	Naviac práce za realizáciu pokusného zarážania štetovnic 08-33-01	5 589,00							
41.	Nepriaznivé geologické podmienky 08-33-06	25.8.2023	Oznámenie o Nároku č. 41 - nepriaznivé geologické podmienky		Nepriaznivé geol. podmienky na základe zrealizovaných sond dynamickej penetrácie								
		30.8.2023	Odpoveď SD										
		8.9.2023	Nárok č. 41 - nepriaznivé geologické podmienky										
		19.9.2023	Odpoveď SD										

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Číslo nároku	Názov Nároku	Dátum	Názov	SO/PS	Stručný popis nároku	Sumár nárokov		Stanovisko AD				Súhlas ŽSR		Súhlas SO			
								Dodatočná platba - predbežne [€]		Predĺženie Lehoty výstavby - predbežne [dn]		požiadané		doručené		požiadané	
42.	Pokusné zarážanie štetovnic 08-32-66	25.8.2023 4.9.2023	Konečný Nárok č. 42 - Pokusné zarážanie štetovnic 08-32-66 Odpoveď SO	08-32-66	Naviac práce za realizáciu pokusného zarážania štetovnic 08-32-66	5 589,00											
43.	Pokusné zarážanie štetovnic 08-33-04	8.9.2023 12.9.2023	Konečný Nárok č. 43 - Pokusné zarážanie štetovnic 08-33-04 Odpoveď SO	08-33-04	Naviac práce za realizáciu pokusného zarážania štetovnic 08-33-04	5 589,00											
44.	Pokusné zarážanie štetovnic	14.9.2023	Nárok č. 44 - pokusné zarážanie štetovnic	08-33-01	Nemožnosť zarážať štetovnice do dĺžky 12m	537 449,43											
45.	Odstránenie nelegálnej skládky odpadu (časť A)	27.9.2023	Konečný Nárok č. 45 - Odstránenie nelegálnej skládky odpadu (časť A)	08-33-21	Naviac práce za likvidáciu nelegálnej skládky odpadu - azbestu	2 241,26											

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Každá Zmena v zmysle ZoD (vrátane zmeny v množstvách), ktorá je zmenou Zmluvy, si vyžaduje uzatvorenie dodatku k ZoD. Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru všetky podporné dokumenty pre účely uzavretia dodatku v zmysle požiadaviek Stavebného dozoru a Objednávateľa. Zmeny, ktoré sú predmetom dodatku, si Zhotoviteľ môže zahrnúť do Prehlásenia podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia), resp. Záverečného Prehlásenia podľa podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie) až po vykonaní prác, ktoré sú predmetom príslušného dodatku a po nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku.

Počet uzatvorených Dodatkov k ZoD: Dodatok č. 1 zo dňa 26.7.2023

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

18. Ponuky Zhotoviteľa

Evidencia PONÚK Zhotoviteľa												
Číslo Ponuky	Názov Ponuky	Sken	Dátum odoslania	SO/PS (popis)	Cena Ponuky	súhlas AD		súhlas ŽSR		Reakcia SD	Sken	Súvisláca dokumentácia
						požiadané	doručené	odoslané	doručené			
1	Výrub - odb. stanovisko pre výrub drevín vyhotovené znalcom		16.9.2022	08-31-51	4 884	x	x	x	email 5.10.2022	Pokyn č. 1		Nárok č. 6, KP č. 1
	Výrub - dokumentácia dendrolog. priestumu				6 105	x	x	x	email 30.11.2022	Pokyn č. 3		
2	Korózný prieskum		28.9.2022		18 583			x	email 5.10.2022	Pokyn č. 2		KP č. 1, Ornámenie č. 7, Ponuka č. 5 Správa Zhotoviteľa 6.12.2022 Správa odstúpená ŽSR Správa odstúpená AD Stanovisko AD k Správe Stanovisko AD odstúpené Zhotoviteľom Odpoveď Zhotoviteľa
3	Instalácia snímačov kontinuálneho sledu úrovne HPV		23.11.2022	08-33-10, 08-33-12, 08-33-14, 08-33-20, 08-33-21	65 000	x	x	x	x	Zamietnuté 23.11.2022		
	Doplnenie Ponuky č. 3		27.1.2023		54 000					Pokyn č. 6		
4	Pasportizácia vodných zdrojov		9.12.2022		127 605	13.12.2022	22.12.2022	17.2.2023	27.3.2023	Pokyn č. 8		Stanovisko SD 11.1.2023 Žiadosť SD 1.2.2023
	Doplnenie Ponuky č. 4		18.1.2023									
	Pasportizácia vodných zdrojov - rozdelenie na sekciu A, B		15.2.2023									
5	Kontrolné merania voči účinkom bludných prúdov		2.5.2023	08-33-17	9 406,75		KP č. 9	11.5.2023	21.7.2023	Pokyn č. 15		Ornámenie č. 7, Ponuka č. 2 Správa Zhotoviteľa 17.8.2023 Správa odstúpená AD 23.8.2023
6	Recyklácia materiálu koľajového lôžka		16.5.2023	08-32-03.A 08-32-03.B	102 602			17.5.2023	18.8.2023	Žiadosť o predloženie rozboru položky 12.4.2023 Požadavka Objednávateľa/SD 30.6.2023 Podmienkové odsúhlasenie 24.8.2023		Ornámenie č. 30 Rozbor položky 13.4.2023 mailová komunikácia júl 2023
7	Odstranenie navážok		18.5.2023	08-33-06	732 072, 28	22.5.2023	8.6.2023	31.5.2023	19.6.2023	Pripomienky SD 22.5.2023 Odpoveď SD 31.5.2023		Nárok č. 25
	Odstranenie navážok - odpoveď na list SD		25.5.2023							Pokyn č. 13		
8	Predvrtanie štetovnic		18.5.2023	08-33-06	977 477, 89			31.5.2023	19.6.2023	Odpoveď SD 31.5.2023 Pokyn č. 14		KP č. 7
9	Zmena technológie zhotovenia podzemnej stený na základe doplnkového IGP		22.5.2023	08-33-10	225 210, 48			23.5.2023	19.6.2023	Pokyn č. 11		Ornámenie č. 24
10	Odstranenie nelegálnej skládky odpadu		22.5.2023	08-33-21	77 094, 07			23.5.2023	19.6.2023	Pokyn č. 12		KD č. 4, 6 Ornámenie č. 3, 6 Nárok č. 5, 7 Zápis KD č. 1
						16.6.2023	21.6.2023			Odpoveď SD 27.6.2023		

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

11	Obchádzková komunikácia do osady Kullovci	15.6.2023	01, 02 08-33-21	990 453, 60															Miestne šetrenie 28.11.2022
																			Pokyn č. 5
12	Ponuka č. 11 - doplnenie	12.7.2023																	
13	Pokusné zarážanie štetovnic	19.6.2023	08-33-06	3 309 517, 09															Ponuka č. 8
14	Realizácia cesty SO 08-38-10 z betónových panelov	12.7.2023	08-38-10	54 859, 46															KP č. 13
15	Zriadenie pažiacej steny pre výkop svahových kŕdel	27.7.2023	08-33-17	431 786,80															Nárok č. 34
																			Žiadosť ŽSR o súhlasyk práciam naviac 11.9.2023
16	Zabezpečenie stavebnej jamy pri OP1	25.8.2023	08-33-06	181 700,38															Ozárnenie č. 45, Nárok č. 23, KP č. 16, Nárok č. 41
																			Žiadosť ŽSR o súhlasyk práciam naviac 11.9.2023
17	Predvŕtanie štetovnic	7.9.2023	08-33-01	537 449,43															Žiadosť ŽSR o súhlasyk práciam naviac 11.9.2023
																			Žiadosť ŽSR o súhlasyk práciam naviac 11.9.2023
18	Navýšenie množstva štetovnicových stien	27.9.2023	08-32-51	38 241,62															Žiadosť ŽSR o súhlasyk práciam naviac 11.9.2023
																			Žiadosť ŽSR o súhlasyk práciam naviac 11.9.2023
19	Kontrolné merania voči účinkom bludných prúdov	27.9.2023	08-33-12	25 345,26															KP č. 9
19	Zakladanie stavebného objektu	27.9.2023	08-33-06	245 190,00															Nárok č. 41

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

19. Zoznam Pokynov SD

Zoznam Pokynov SD						
Číslo Pokynu	Názov	SO	žiadosť ŽSR	predchádzajúci súhlas ŽSR	pokyn vydaný dňa	dodatok
1	Pokyn SD č. 1 - na zrealizovanie Odborného stanoviska pre výrub drevín vyhotovené znalcom	08-31-51	5.10.2022	-	5.10.2022	1
2	Pokyn SD č. 2 - Korózny prieskum		5.10.2022	-	5.10.2022	1
3	Pokyn SD č. 3 - na doplnenie Odborného stanoviska pre výrub drevín vyhotovené znalcom o stanovenie celospoločenskej hodnoty drevín		30.11.2022	-	30.11.2022	
4	Pokyn SD č. 4 - na zrealizovanie výrubu stromov	08-31-51	7.12.2022	-	14.12.2022	1
5	Pokyn SD č. 5 - Zabezpečenie inžinierskej činnosti a vypracovanie PD na zriadenie prístupovej komunikácie do osady Kullovci		20.1.2023	-	20.1.2023	
6	Pokyn SD č. 6 - Ponuka č. 3 - Inštalácia snímačov kontinuálneho sledu úrovne HPV	08-33-10 08-33-12 08-33-14 08-33-21	-	24.2.2023	27.2.2023	
7	Pokyn SD č. 7 - Predkladanie dokumentácie TP a KSP min. 14 dní pred začatím prác		-	-	9.3.2023	
8	Pokyn SD č. 8 - Ponuka č. 4 - Pasportizácia vodných zdrojov a následný monitoring do konca výstavby	08-33-04 08-33-06 08-33-10 08-33-14 08-33-21	-	27.3.2023	27.3.2023	
9	Pokyn SD č. 9 - Nárok č. 14 - zmena polohy bodov vytyčovacej siete, všeobecné požiadavky Sekcia A, Sekcia B	08-35-01	-	19.4.2023	20.4.2023	
10	Pokyn SD č. 10 - Preberanie častí konštrukcií		-	-	25.4.2023	
11	Pokyn č. 11 - Ponuka č. 9 - zmena technológie zhotovenia podzemnej steny SO 08-33-10 na základe dIGP	08-33-10	-	19.6.2023	19.6.2023	
12	Pokyn SD č. 12 - Ponuka č. 10 - odstránenie nelegálnej skládky odpadu	08-33-21	-	19.6.2023	19.6.2023	
13	Pokyn SD č. 13 - Ponuka č. 7 - odstránenie navážok	08-33-06	-	19.6.2023	21.6.2023	
14	Pokyn SD č. 14 - Ponuka č. 8 - predvrtávanie štetovnic	08-33-06	-	19.6.2023	28.6.2023	
15	Pokyn SD č. 15 - Meranie voči účinkom bl. prúdov SO 08-33-17	08-33-17	-	21.7.2023	24.7.2023	
16	Pokyn SD č. 16 - ponuka č. 11 - obchádzková komunikácia do osady Kullovci - doplnenie	08-33-21 01, 02	9.8.2023	-	10.8.2023	
17	Pokyn SD č. 17 - Ponuka č. 13 – realizácia cesty SO 08-38-10 z betónových panelov	08-38-10	9.8.2023	-	10.8.2023	

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

20. Evidencia Podzhotoviteľov schválených SD

Schválení Podzhotovitelia					
Do 3 %					
Názov firmy	RPVS	Objem prác v %	SO/PS	Náplň práce	Schválená dňa
JPRL s.r.o.	áno	0,15	08-31-51	výrub stromov	27.10.2022
ZAKLADANIE OK, s.r.o.	áno	0,62	08-33-17 08-33-21	štetovnice	27.10.2022
JOKO Čadca, s.r.o.	áno	0,055	celá stavba	čistenie komunikácií	8.11.2022
CONTROL-VHS-SK	áno	0,3	celá stavba	laboratórne skúšky	7.12.2022
Žilinská univerzita v Žiline	áno	0,06	celá stavba	laboratórne skúšky	7.12.2022
AQUABELES s.r.o.	nie	0,027	celá stavba	monitoring zložiek životného prostredia	19.1.2023
Lu - Vas, s.r.o.	áno	0,22	08-38-10	preložka lesnej cesty	3.2.2023
VUZ Slovakia, s.r.o.	nie	0,073	celá stavba	Posúdenie súladu stavby s požiadavkami TSI	2.2.2023
Lu - Vas, s.r.o.	áno	1,6 (1,6 + 0,22 = 1,82)	08-35-01.A 08-35-01.B	zakladanie, búranie, zemné práce	17.3.2023
Lu - Vas, s.r.o.	áno	0,35 (1,82 + 0,35 = 2,17)	08-38-01	zakladanie, zemné práce, búranie, komunikácie	30.3.2023
GASMONTA s.r.o.	áno	2,29	08-37-01 08-37-02 08-37-03 08-37-04 08-37-05 08-37-06	preložky IS - voda, kanalizácia, plyn	21.4.2023
T.B.stav s.r.o.	áno	1,49	08-34-01.A 08-34-01.B	protihlukové steny	17.5.2023
Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka BA	áno	1,18	08-33-06	špeciálne zakladanie - predvrty pre zabaranenie štetovnic	27.7.2023
ZAKLADANIE OK, s.r.o.	áno	1,213 (0,62 + 1,213=1,833)	08-33-01 08-33-03 08-33-04	štetovnice	21.8.2023
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.	áno	1,51	08-33-03 08-33-04 02	práce na rekonštrukcii žel. mosta: špeciálne zakladanie - striekaný betón a pilóty; dočasná obchádzková komunikácia - zabezpečenie stability svahu	20.9.2023
VHS-Geotech, s.r.o.	áno	2,14	08-33-12	práce na zárubnom múre pri koľaji č. 1	20.9.2023

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Schválení Podzhotovitelia							
Nad 3%							
Názov firmy	RPVS	Objem prác v %	SO/PS	Náplň práce	ŽSR požiadané o predchádzajúci súhlas	Schválené na ŽSR	Schválené SD
AŽD Praha s.r.o.	áno	9,09	celá stavba	zabzar	27.10.2022	1.12.2022	10.1.2023
RB STEEL s.r.o.	áno	4,83	celá stavba	dodávka materiálu- oceľ, železo	8.11.2022	16.11.2022	30.11.2022
STAPP s.r.o.	áno	4,42	03-33-17 08-33-21	realizácia celého SO	15.11.2022	1.12.2022	10.1.2023
DANUCEM Slovensko a.s.	áno	4,08	celá stavba	dodávka materiálu- betón	1.12.2022	22.12.2022	10.1.2023
Elektrizace železnic Praha a.s.	áno	7,25	08-35-01.A 08-35-02.A 08-35-01.B 08-35-02.B	práce na trakčnom vedení uvedených SO	7.12.2022	22.12.2022	10.1.2023
STAPP s.r.o.	áno	8,80 (4,42 + 8,80 = 13,22)	08-33-06	nový železničný most - bez nosnej OK	2.5.2023	19.6.2023	19.6.2023
Cofra-Chemia s.r.o.	áno	9,75	08-33-10	zárubný múr pri koľaji č. 1	11.7.2023	24.7.2023	3.8.2023
T.B.stav s.r.o.	áno	4,28 (1,49 + 4,28 = 5,77)	08-32-51, 52, 53, 54, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 60, 61, 62, 63, 65, 66	rekonštrukcia priepustov, nové priepusty	31.7.2023	14.8.2023	21.8.2023

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

21. Evidencia pracovných rokovaní

Evidencia Kontrolných dní		Evidencia Koordinačných porád	
Poradové číslo KD	Termín konania KD	Poradové číslo KP	Termín konania KP
1	21.9.2022	1	12.9.2022
2	12.10.2022	2	3.10.2022
3	2.11.2022	3	17.10.2022
4	23.11.2022	4	7.11.2022
5	14.12.2022	5	30.1.2023
6	18.1.2023	6	20.2.2023
7	8.2.2023	7	20.3.2023
8	8.3.2023	8	3.4.2023
9	29.3.2023	9	17.4.2023
10	19.4.2023	10	27.4.2023
11	10.5.2023	11	18.5.2023
12	31.5.2023	12	12.6.2023
13	21.6.2023	13	26.6.2023
14	12.7.2023	14	10.7.2023
15	2.8.2023	15	2.8.2023
16	23.8.2023	16	14.8.2023
17	13.9.2023	17	6.9.2023
		18	25.9.2023

Záznamy z horeuvedených rokovaní sú zasielané účastníkom rokovania elektronicky.

Platí, že poverení zástupcovia Objednávateľa, Zhotoviteľa, Autorského dozoru a Stavebného dozoru svojim podpisom potvrdzujú správnosť a úplnosť zápisu z Kontrolného dňa alebo Koordinačnej porady, ktorý predstavuje autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach. Tento zápis však v zmysle znenia čl. 3.6 Osobitných podmienok ZoD nemôže nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy o Dielo ani žiadosť o schválenie, schválenie, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej forme.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

22. Záver



Cieľom tejto priebežnej správy predmetnej stavby bolo poskytnúť údaje o začatí a vývoji činnosti poskytovateľa a aktuálnom stave na stavbe.

Súčasťou správy sú zistenia, závery, názory a odporúčania SD vyplývajúce zo skutkového stavu na stavbe a poskytnutej PD stavby.

Správa sa Objednávateľovi poskytuje trikrát v elektronickej forme na CD a trikrát vo vytlačenej forme.

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca



23. Fotografické prílohy

Objekt:	PS 08-21-02.2 A Čadca štátna hranica ČR/SR, zabezpečenie stavebných postupov SP2.2, Sekcia A Čadca - Svrčinovec	07 - 09/2023
		
Demontovaný materiál uložený v priestoroch zhotoviteľa	Demontovaný materiál uložený v priestoroch zhotoviteľa	

Objekt:	SO 08-32-02.A Čadca - štátna hranica ČR/SR, železničný spodok	07 - 09/2023
		
Plášť železničného spodku na preložke	Odvodnenie - spevnené priekopy	

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Objekt:	SO 08-32-03.A Čadca - štátna hranica ČR/SR, železničný zvršok - demontáž	07 - 09/2023
		
Odkop štrkového lôžka v kol'.č. 1		Demontáž nástupišťa pri kol'.č. 1

Objekt:	SO 08-32-51, 52 ,53.A Čadca - štátna hranica ČR/SR, priepusty	08 - 09/2023
		
Larseny a podkladný betón a ŽB rámy		PE-HD rúra DN 1000 vo vyčistenom stávajúcom priepuste

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Objekt:	SO 08-33-01 - rekonštrukcia žel.mostov v nžkm 279,461 58	3. kvartál 2023
---------	--	-----------------




Zarážací pokus



Zarážací pokus



Demontáž PHS

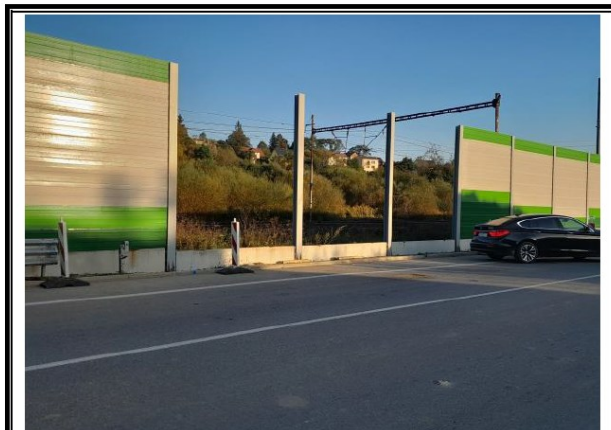

Demontáž PHS

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Objekt:	SO 08-33-03 - rekonštrukcia žel.mosta v nžkm 280,406 74	3. kvartál 2023
---------	---	-----------------



Zarážanie štetovnic



Realizácia pažiacej štetovnicovej steny



Realizácia pažiacej štetovnicovej steny



Realizácia pažiacej štetovnicovej steny





Realizácia pažiacej štetovnicovej steny


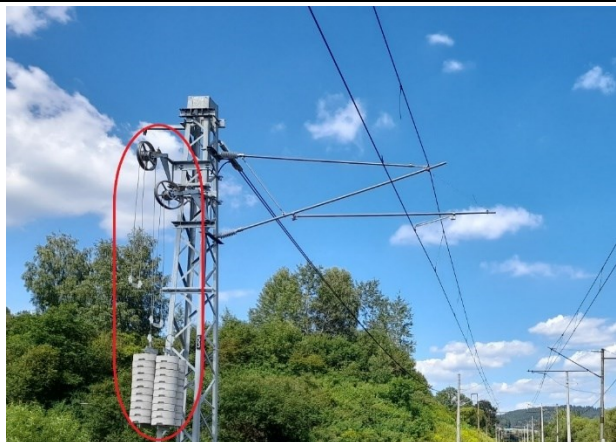




Realizácia pažiacej štetovnicovej steny





Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Objekt:	SO 08-33-10.A Čadca - štátna hranica ČR/SR, zárubný múr pri kol. č.1. v nžkm 281,605 – nžkm 282,080	07 - 09/2023
		
Vŕtanie VPP	Montáž výstuže a debnenia rímsy	

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Objekt:	SO 08-35-01 A Čadca štátna hranica ČR/SR, trakčné vedenie	07 - 09/2023
		
Montáž priehradového stožiara typ BP stožiara	Pohyblivé kotvenie zostavy TV na BP 154	
		
Pevné kotvenie TV na BP	Odvoz betónových základov podpier TV po demontáži	

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Objekt:	SO 08-35-02 A Čadca štátna hranica ČR/SR, ukoľajnenie oceľových konštrukcii	07 - 09/2023
		
Demontáže ukoľajnenie s prierazkou	Montáž ukoľajnenia stožiaru s prierazkou	
		
Montáž provizórneho ukoľajnenia dvojice stožiarov	Montáž provizórneho ukoľajnenia TS stožiaru	

Inžinierske združenie BUNG - INFRAM v zastúpení BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Inžinierske združenie BUNG – INFRAM, Podzávoz 302, 022 01 Čadca

Objekt:	SO 08-38-01- prístupová komunikácia cez rieku Čierňanka	3. kvartál 2023
---------	---	-----------------



Pokládka geotextílie



Pokládka geotextílie



Statická zaťažovacia skúška



Zemné práce



Odstraňovanie azbestu



Pokládka geotextílie

Koniec správy.
