CELKOVÝ HARMONOGRAM DIELA

Identifi	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie
1	**„Rekonštrukcia FNsP FDR, Banská Bystrica“**	**Ut 1.1.19**	**Po 31.7.23**
2	Vypísanie VO	Ut 1.1.19	Ut 1.1.19
3	Proces VO	Str 2.1.19	Št 1.8.19
4	Uzavretie Zmluvy o Dielo	Št 1.8.19	Št 1.8.19
5	Účinnosť zmluvy	Pi 2.8.19	Pi 2.8.19
6	Projekčné práce	Pi 2.8.19	Po 22.6.20
7	Vypracovanie geodetického zamerania	Pi 2.8.19	Po 12.8.19
8	Zrealizovanie geologického prieskumu	Pi 2.8.19	Št 15.8.19
9	Dokumentácia EIA (Oznámenie o zmene EIA)	Pi 2.8.19	Str 21.8.19
10	IČ - Získanie vyjadrenia o zmene EIA	Pi 2.8.19	Ut 1.10.19
11	Dokumentácia pre územné rozhodnutie (UR)	Pi 16.8.19	Pi 13.9.19
12	IČ - získanie rozhodnutia o umiestnení stavby	Ut 1.10.19	Pi 29.11.19
13	IČ - Získanie právoplatného územného rozhodnutia	Pi 29.11.19	Po 30.12.19
14	Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	Ut 31.12.19	Po 30.3.20
15	Kontrola dokumentácie dozorom	Pi 28.2.20	Po 30.3.20
16	IČ - získanie stavebného povolenia	Po 30.3.20	Po 1.6.20
17	IČ - Získanie právoplatného stavebného povolenia	Ut 2.6.20	Str 1.7.20
18	Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS)	Ut 31.3.20	Po 22.6.20
19	Dielenská , montážna a koordinačná dokumentácia	Ut 23.6.20	Po 24.8.20
20	Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) – dokumentácia všetkých stavebných objektov	Št 26.8.21	Str 19.7.23
21	Porealizačné zameranie stavebných objektov	Str 20.5.20	Str 19.7.23
22	Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie zhotoviteľa stavebným dozorom	Ut 2.6.20	Po 24.8.20
23	Komplexné skúšky	Po 1.6.20	Št 13.7.23
24	IČ - Príprava na kolaudačné rozhodnutie	Pi 14.7.23	Št 27.7.23
25	IČ - Získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia	Pi 28.7.23	Pi 28.7.23
26	IČ - Úžívacie povolenie	Po 31.7.23	Po 31.7.23
27	PREBRATIE STAVENISKA	Št 2.7.20	Št 2.7.20
28	**Zariadenie staveniska - zriadenie**	**Št 2.7.20**	**Str 8.7.20**
29	ZS 1	Št 2.7.20	Ut 7.7.20
30	ZS 2	Št 2.7.20	Str 8.7.20
31	Začiatok stavebných prác	Št 2.7.20	Št 2.7.20
32	Začiatok stavebných prác - prípravné práce - príprava pomocných priestorov	Str 1.7.20	Str 1.7.20
33	**Príprava priestorov pre lekárov, sestry a šatne (prístavba trvalých priestorov pod blokom B1,B2))**	**Str 1.7.20**	**Št 1.10.20**
34	Kontrola dokumentácie dozorom	Str 1.7.20	Ut 7.7.20
35	Realizácia prác	Str 8.7.20	Št 24.9.20
36	Skúšky pre priestory prístavby trvalých priestorov pod blokom B1 a B2	Pi 25.9.20	Str 30.9.20
37	Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 11.9.20	Str 30.9.20
38	IČ - Dočasné užívanie stavby	Št 1.10.20	Št 1.10.20
39	Prevzatie objektu do predčasného užívania	Pi 25.9.20	Pi 25.9.20
40	Sťahovanie priestorov Endoskopie	Po 28.9.20	Pi 9.10.20
41	**Rekonštrukcia priestorov Endoskopie (blok B, podlažie +1)**	**Str 1.7.20**	**Št 1.10.20**
42	Kontrola dokumentácie dozorom	Str 1.7.20	Ut 7.7.20
43	Realizácia prác	Str 8.7.20	Št 24.9.20
44	Skúšky pre priestory novej ENDOSKOPIE	Pi 25.9.20	Str 30.9.20
45	Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 11.9.20	Str 30.9.20
46	IČ - Dočasné užívanie stavby	Št 1.10.20	Št 1.10.20
47	Prevzatie objektu do predčasného užívania	Pi 25.9.20	Pi 25.9.20
48	**B1**	**Ut 1.10.19**	**Str 26.1.22**
49	Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác	Ut 1.10.19	Po 2.12.19
50	Kontrola dokumentácie dozorom	Št 31.10.19	Po 2.12.19
51	**B1 Ľavé krídlo**	**Št 2.7.20**	**Str 28.4.21**
52	Vonkajšie výťahy pre B1 vľavo	Št 2.7.20	Str 3.3.21
53	Demolačné práce	Št 2.7.20	Str 28.10.20
54	Výmena okenných výplní	Št 16.7.20	Str 23.12.20
55	Rekonštrukcia fasády	Št 24.9.20	Str 17.2.21
56	Murovacie práce	Št 30.7.20	Str 2.12.20
57	Dlažby a obklady	Št 6.8.20	Str 9.12.20
58	Omietky	Št 20.8.20	Str 16.12.20
59	Podhľady	Št 10.9.20	Str 13.1.21
60	Podlahy	Po 21.9.20	Pi 22.1.21
61	Výplne otvorov	Po 16.11.20	Pi 1.1.21
62	elektroinštalácie	Št 9.7.20	Ut 19.1.21
63	Vzduchotechnika	Št 9.7.20	Pi 1.1.21
64	Zdravotechnika	Št 9.7.20	Št 21.1.21
65	Vykurovanie	Št 9.7.20	Str 13.1.21
66	Ostatné profesie pre B1 vľavo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH	Št 9.7.20	Po 11.1.21

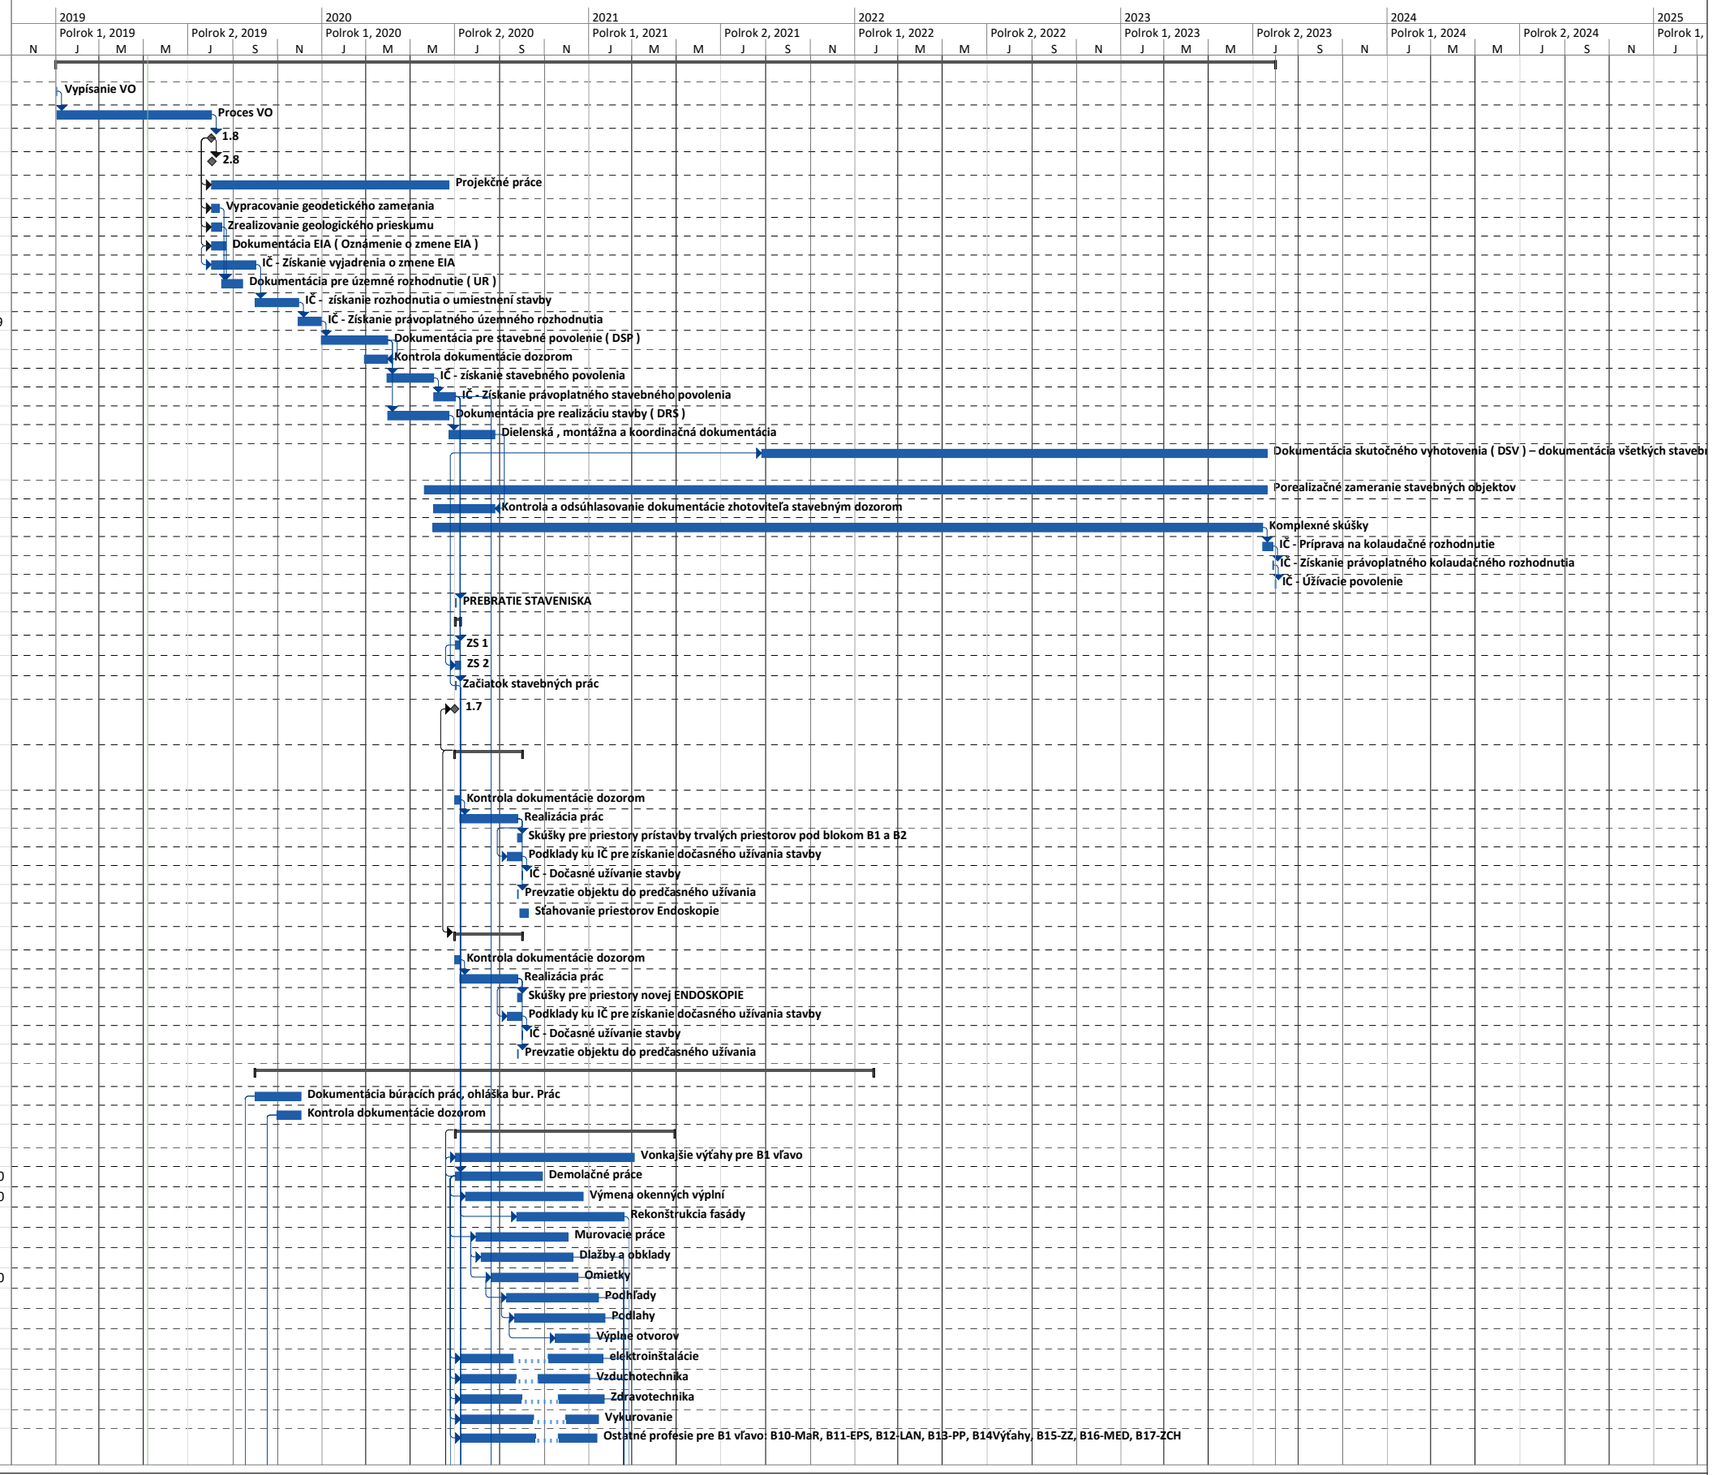

CELKOVÝ HARMONOGRAM DIELA

Identifi		Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie
67		Dokončovacie práce	Št 18.2.21	Str 31.3.21
68		Komplexné skúšky objektu B1 vľavo	Str 7.4.21	Po 12.4.21
69		Supis vád objektu B1 vľavo, odstranenie vád	Št 8.4.21	Ut 27.4.21
70		Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Str 10.3.21	Pi 19.3.21
71		IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Po 22.3.21	Po 22.3.21
72		Prevzatie objektu B1 vľavo	Str 28.4.21	Str 28.4.21
73		**Zdroje tepla K1, K2 , OTS + vonkajšie rozvody + plynová prípojka**	**Št 2.7.20**	**Str 13.1.21**
74		Stavebné práce	Št 2.7.20	Ut 29.12.20
75		Ostré prepoje	Str 30.12.20	Str 13.1.21
76		**B1 Pravé krídlo**	**Št 1.4.21**	**Str 29.12.21**
77		Vonkajšie výťahy pre B1 vpravo	Št 1.4.21	Str 1.12.21
78		Demolačné práce	Št 1.4.21	Str 28.7.21
79		Výmena okenných výplní	Št 15.4.21	Str 22.9.21
80		Rekonštrukcia fasády	Št 24.6.21	Str 17.11.21
81		Murovacie práce	Št 29.4.21	Str 1.9.21
82		Dlažby a obklady	Št 6.5.21	Str 8.9.21
83		Omietky	Št 20.5.21	Str 15.9.21
84		Podhľady	Št 10.6.21	Str 13.10.21
85		Podlahy	Po 21.6.21	Pi 22.10.21
86		Výplne otvorov	Po 16.8.21	Pi 1.10.21
87		elektroinštalácie	Št 8.4.21	Ut 19.10.21
88		Vzduchotechnika	Št 8.4.21	Pi 1.10.21
89		Zdravotechnika	Št 8.4.21	Št 21.10.21
90		Vykurovanie	Št 8.4.21	Pi 15.10.21
91		Ostatné profesie pre B1 vpravo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH	Št 8.4.21	Pi 15.10.21
92		Dokončovacie práce	Št 18.11.21	Str 29.12.21
93		Rekonštrukcia strechy	Št 16.7.20	Str 3.3.21
94		Komplexné skúšky objektu B1 vpravo	Str 5.1.22	Po 10.1.22
95		Supis vád objektu B1 vpravo, odstranenie vád	Št 6.1.22	Ut 25.1.22
96		Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Str 8.12.21	Pi 17.12.21
97		IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Po 20.12.21	Po 20.12.21
98		Prevzatie objektu B1 vpravo	Str 26.1.22	Str 26.1.22
99		**B2**	**Ut 1.10.19**	**Pi 21.7.23**
100		Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác	Ut 1.10.19	Po 2.12.19
101		Kontrola dokumentácie dozorom	Št 31.10.19	Po 2.12.19
102		**B2 Ľavé krídlo**	**Št 30.12.21**	**Pi 14.10.22**
103		Vonkajšie výťahy pre B2 vľavo	Št 30.12.21	Str 31.8.22
104		Demolačné práce	Št 30.12.21	Str 27.4.22
105		Výmena okenných výplní	Št 13.1.22	Str 22.6.22
106		Rekonštrukcia fasády	Št 24.3.22	Str 17.8.22
107		Murovacie práce	Št 27.1.22	Str 1.6.22
108		Dlažby a obklady	Št 3.2.22	Str 8.6.22
109		Omietky	Št 17.2.22	Str 15.6.22
110		Podhľady	Št 10.3.22	Str 13.7.22
111		Podlahy	Po 21.3.22	Pi 22.7.22
112		Výplne otvorov	Po 16.5.22	Pi 1.7.22
113		elektroinštalácie	Št 6.1.22	Ut 19.7.22
114		Vzduchotechnika	Št 6.1.22	Pi 1.7.22
115		Zdravotechnika	Št 6.1.22	Št 21.7.22
116		Vykurovanie	Št 6.1.22	Str 13.7.22
117		Ostatné profesie pre B2 vľavo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH	Št 6.1.22	Ut 12.7.22
118		Dokončovacie práce	Št 18.8.22	Str 28.9.22
119		Komplexné skúšky objektu B2 vľavo	Pi 23.9.22	Str 28.9.22
120		Supis vád objektu B2 vľavo, odstranenie vád	Po 26.9.22	Št 13.10.22
121		Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Str 7.9.22	Št 15.9.22
122		IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Pi 16.9.22	Pi 16.9.22
123		Prevzatie objektu B2 vľavo	Pi 14.10.22	Pi 14.10.22
124		**B2 Pravé krídlo**	**Št 29.9.22**	**Št 13.7.23**
125		Vonkajšie výťahy pre B2 vpravo	Št 29.9.22	Str 31.5.23
126		Demolačné práce	Št 29.9.22	Str 25.1.23
127		Výmena okenných výplní	Št 13.10.22	Str 22.3.23
128		Rekonštrukcia fasády	Št 17.11.22	Str 12.4.23
129		Murovacie práce	Št 8.12.22	Str 12.4.23
130		Dlažby a obklady	Št 15.12.22	Str 19.4.23
131		Omietky	Št 29.12.22	Str 26.4.23
132		Podhľady	Št 19.1.23	Str 24.5.23
133		Podlahy	Po 30.1.23	Pi 2.6.23
134		Výplne otvorov	Po 27.3.23	Pi 12.5.23
135		elektroinštalácie	Št 6.10.22	Ut 18.4.23

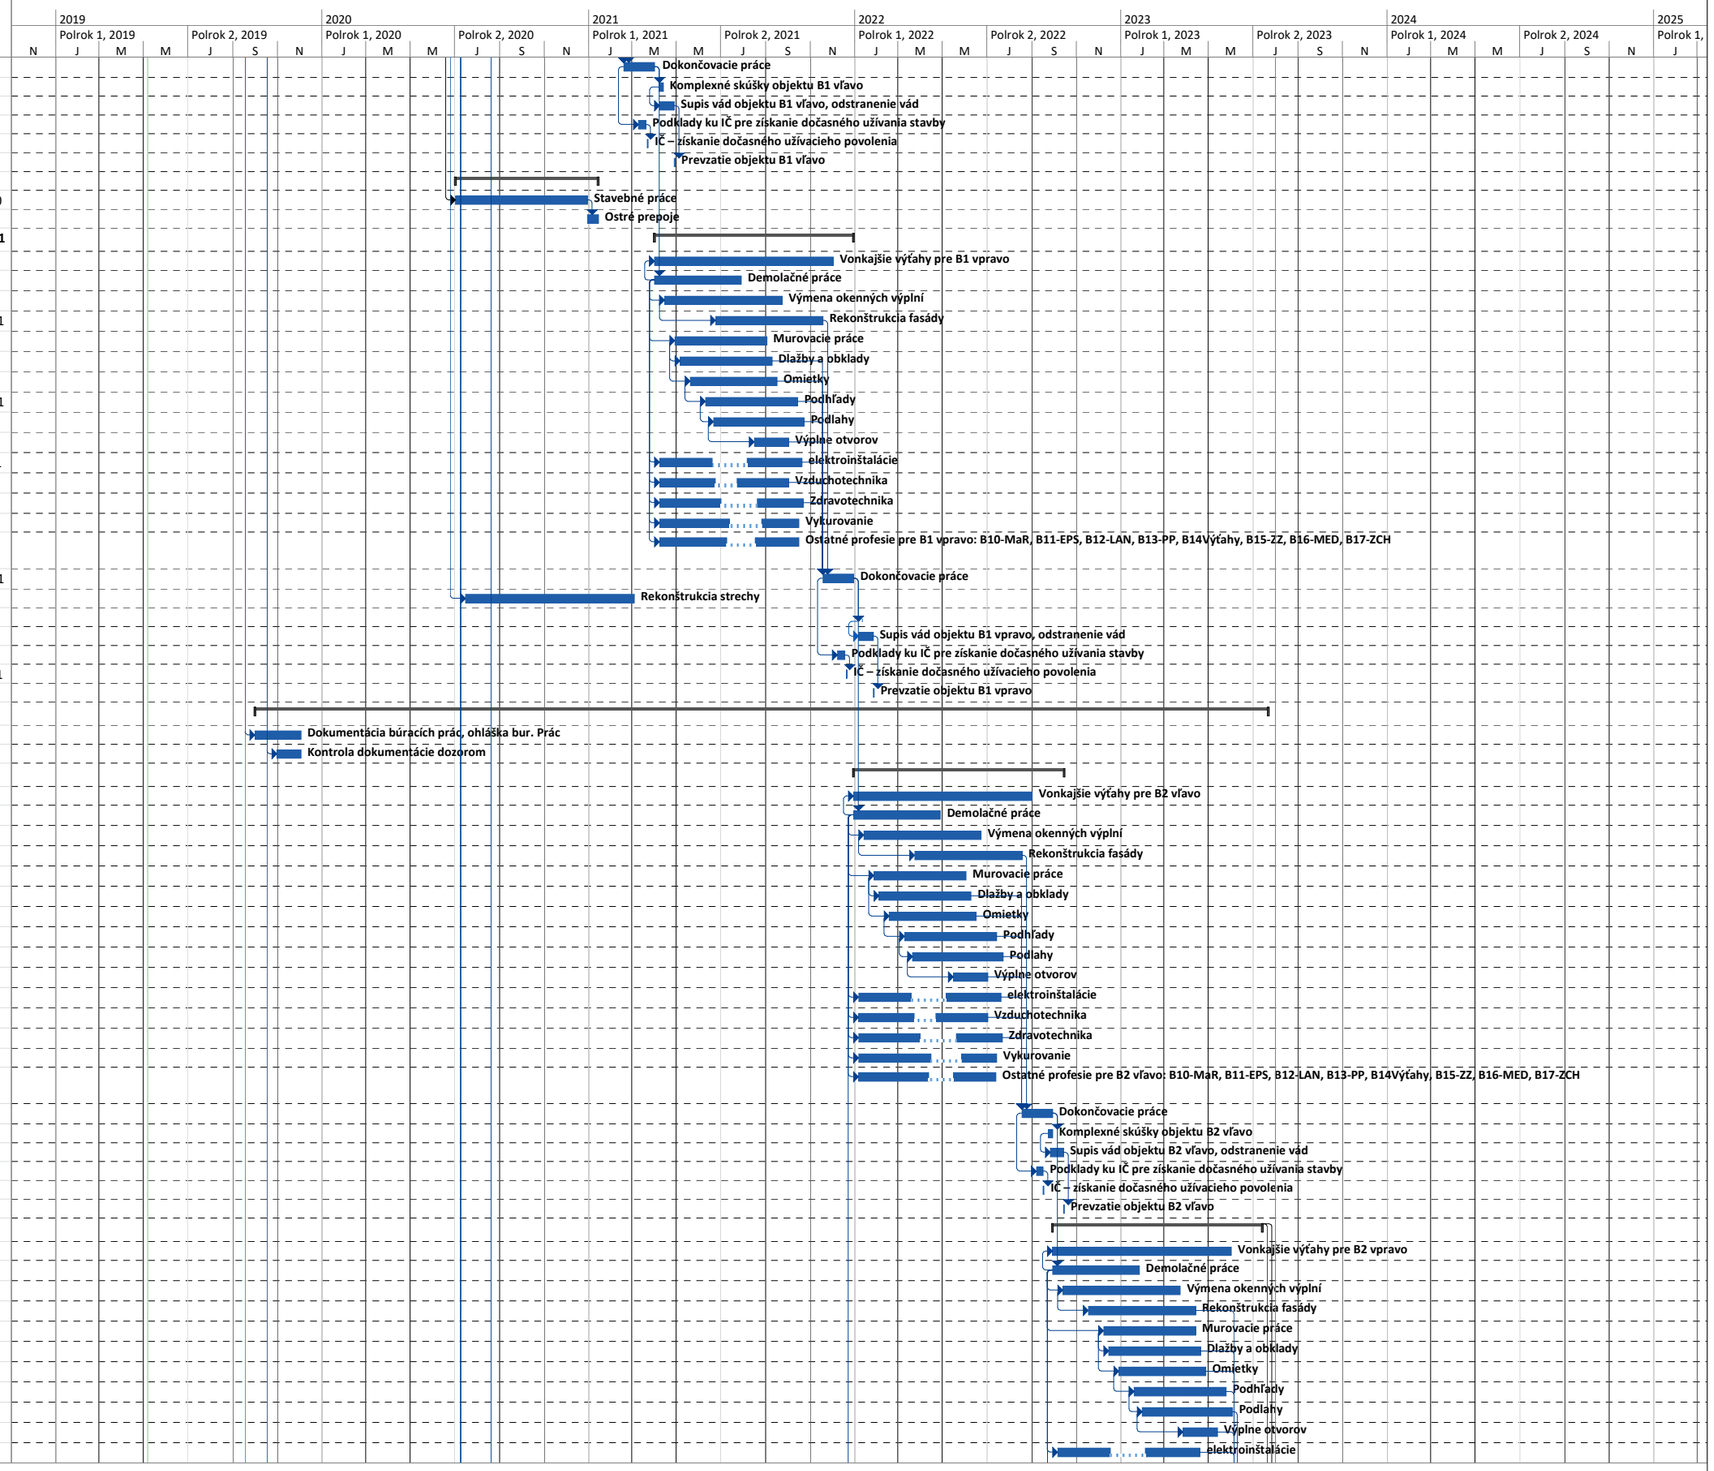

CELKOVÝ HARMONOGRAM DIELA

Identifi		R	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie
136			Vzduchotechnika	Št 6.10.22	Pi 31.3.23
137			Zdravotechnika	Št 6.10.22	Št 20.4.23
138			Vykurovanie	Št 6.10.22	Št 20.4.23
139			Ostatné profesie pre B2 vpravo: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B14-Výťahy, B15-ZZ, B16-MED, B17-ZCH	Št 6.10.22	Ut 25.4.23
140			Dokončovacie práce	Po 5.6.23	Št 13.7.23
141			Rekonštrukcia strechy	Št 13.1.22	Str 10.8.22
142			Komplexné skúšky objektu B2 vpravo	Po 10.7.23	Št 13.7.23
143			Supis vád objektu B2 vpravo, odstranenie vád	Po 3.7.23	Št 20.7.23
144			Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 23.6.23	Po 3.7.23
145			IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Ut 4.7.23	Ut 4.7.23
146			Prevzatie objektu B2 vpravo	Pi 21.7.23	Pi 21.7.23
147			**Blok B a B-prepojovací krčok**	**Ut 1.10.19**	**Št 17.6.21**
148			Dokumentácia búracích prác, ohláška bur. Prác	Ut 1.10.19	Po 2.12.19
149			Kontrola dokumentácie dozorom	Št 31.10.19	Po 2.12.19
150			Výmena okenných výplní	Št 2.7.20	Str 21.10.20
151			Rekonštrukcia strechy	Št 20.8.20	Str 6.1.21
152			Rekonštrukcia fasády	Št 22.10.20	Str 2.6.21
153			Práce v interiéri	Št 2.7.20	Str 2.6.21
154			Ostatné profesie pre B a B-prepojovací krčok: B10-MaR, B11-EPS, B12-LAN, B13-PP, B16-MED, B17-ZCH	Št 27.8.20	Str 12.5.21
155			Komplexné skúšky objektu B	Št 3.6.21	Pi 4.6.21
156			Supis vád objektu B, odstranenie vád	Št 3.6.21	Str 16.6.21
157			Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Št 3.6.21	Str 16.6.21
158			IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Št 17.6.21	Št 17.6.21
159			Prevzatie objektu B	Št 17.6.21	Št 17.6.21
160			**Blok C**	**Št 2.7.20**	**Št 11.2.21**
161			Kontrola dokumentácie dozorom	Pi 3.7.20	Št 16.7.20
162			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Št 14.1.21	Str 10.2.21
163			Výmena okenných výplní	Št 2.7.20	Str 9.9.20
164			Rekonštrukcia strechy	Št 30.7.20	Str 11.11.20
165			Rekonštrukcia fasády	Št 10.9.20	Str 27.1.21
166			Práce v interiéri (chodby)	Št 2.7.20	Str 6.1.21
167			Komplexné skúšky objektu C	Št 28.1.21	Pi 29.1.21
168			Supis vád objektu C, odstranenie vád	Št 28.1.21	Str 10.2.21
169			Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Št 28.1.21	Str 10.2.21
170			IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Št 11.2.21	Št 11.2.21
171			Prevzatie objektu C	Št 11.2.21	Št 11.2.21
172			**Blok D1**	**Pi 5.2.21**	**Pi 15.10.21**
173			Kontrola dokumentácie dozorom	Pi 5.2.21	Št 18.2.21
174			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Pi 3.9.21	Št 30.9.21
175			Výmena okenných výplní	Pi 19.2.21	Št 13.5.21
176			Rekonštrukcia strechy	Pi 12.3.21	Št 8.7.21
177			Rekonštrukcia fasády	Pi 14.5.21	Št 30.9.21
178			Práce v interiéri (chodby)	Pi 19.2.21	Št 12.8.21
179			Komplexné skúšky objektu D1	Pi 1.10.21	Po 4.10.21
180			Supis vád objektu D1, odstranenie vád	Pi 1.10.21	Št 14.10.21
181			Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 1.10.21	Št 14.10.21
182			IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Pi 15.10.21	Pi 15.10.21
183			Prevzatie objektu D1	Pi 15.10.21	Pi 15.10.21
184			**Blok D2**	**Pi 10.9.21**	**Pi 20.5.22**
185			Kontrola dokumentácie dozorom	Pi 10.9.21	Št 23.9.21
186			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Pi 8.4.22	Št 5.5.22
187			Výmena okenných výplní	Pi 24.9.21	Št 16.12.21
188			Rekonštrukcia strechy	Pi 15.10.21	Št 10.2.22
189			Rekonštrukcia fasády	Pi 17.12.21	Št 5.5.22
190			Komplexné skúšky objektu D2	Pi 6.5.22	Po 9.5.22
191			Supis vád objektu D2, odstranenie vád	Pi 6.5.22	Št 19.5.22
192			Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 6.5.22	Št 19.5.22
193			IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Pi 20.5.22	Pi 20.5.22
194			Prevzatie objektu D2	Pi 20.5.22	Pi 20.5.22
195			**BLOK rádiológie**	**Pi 18.2.22**	**Pi 23.12.22**
196			Kontrola dokumentácie dozorom	Pi 18.2.22	Št 3.3.22
197			Rekonštrukcia	Pi 4.3.22	Št 8.12.22
198			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Pi 11.11.22	Št 8.12.22
199			Výmena okenných výplní	Pi 4.3.22	Št 21.7.22
200			Rekonštrukcia strechy	Pi 1.4.22	Str 26.10.22
201			Rekonštrukcia fasády	Pi 22.4.22	Št 8.12.22
202			Komplexné skúšky objektu Rádiologia	Pi 9.12.22	Po 12.12.22
203			Supis vád objektu Rádiológia, odstranenie vád	Pi 9.12.22	Št 22.12.22
204			Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 9.12.22	Št 22.12.22
205			IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Pi 23.12.22	Pi 23.12.22
206			Prevzatie objektu Rádiológia	Pi 23.12.22	Pi 23.12.22
207			**BLOK Klinická onkológia**	**Pi 17.7.20**	**Pi 14.5.21**
208			Kontrola dokumentácie dozorom	Pi 17.7.20	Št 30.7.20

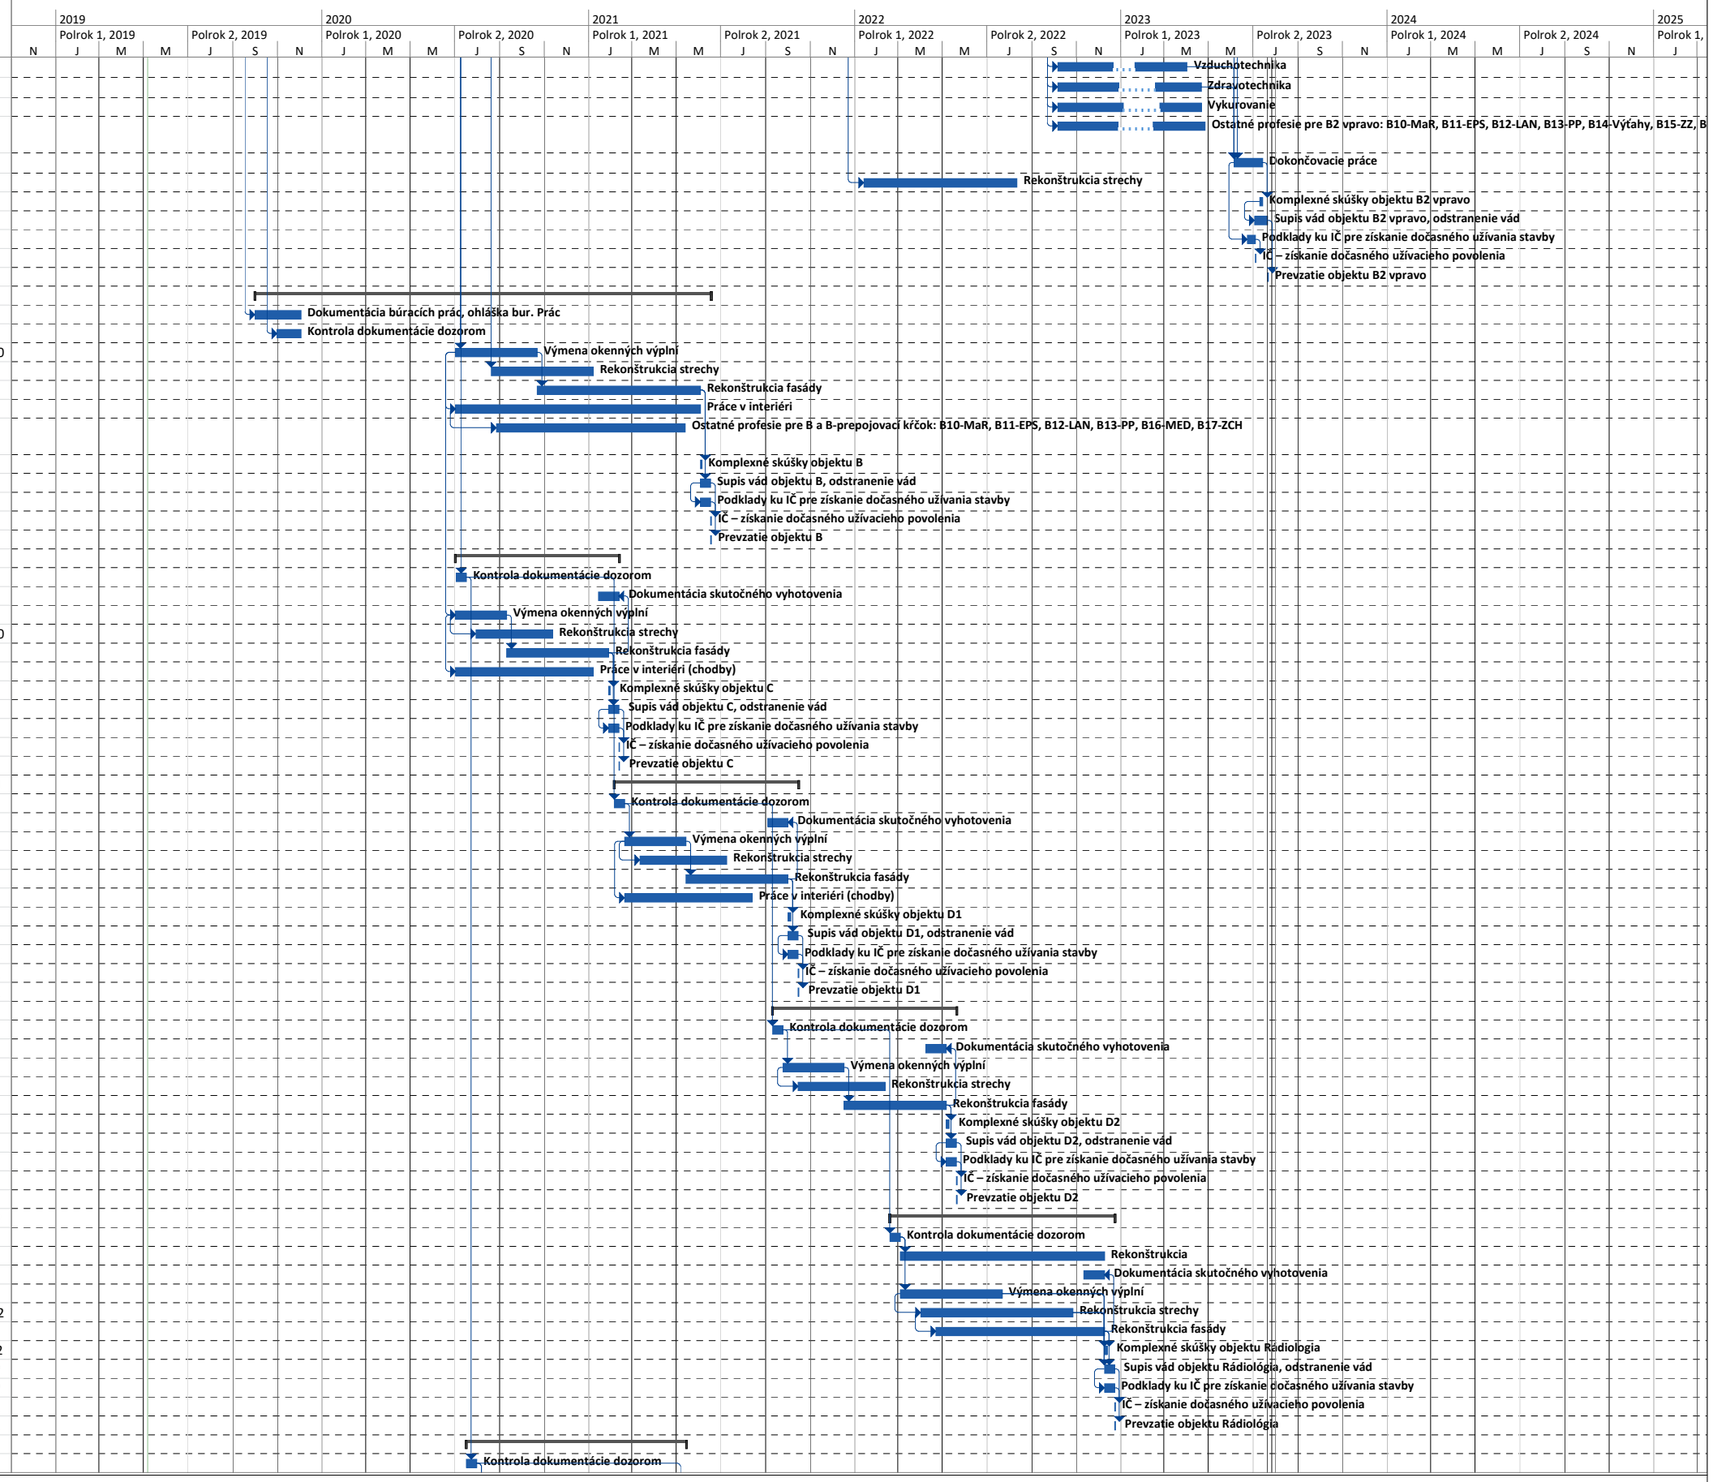

CELKOVÝ HARMONOGRAM DIELA
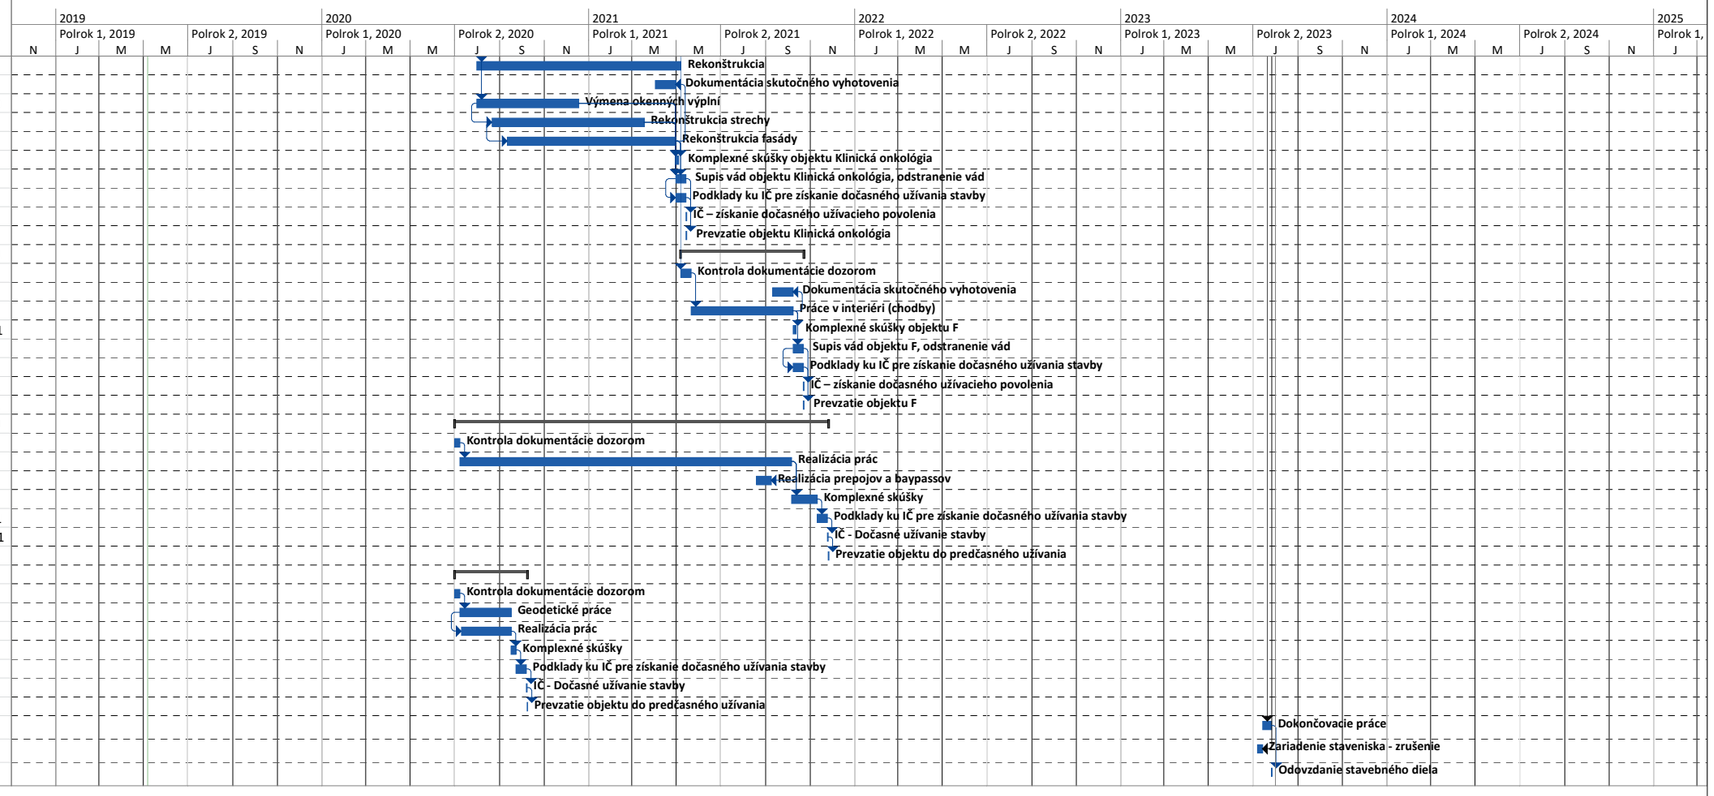
Identifi	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie
209	Rekonštrukcia	Pi 31.7.20	Št 6.5.21
210	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Pi 2.4.21	Št 29.4.21
211	Výmena okenných výplní	Pi 31.7.20	Št 17.12.20
212	Rekonštrukcia strechy	Pi 21.8.20	Str 17.3.21
213	Rekonštrukcia fasády	Pi 11.9.20	Št 29.4.21
214	Komplexné skúšky objektu Klinická onkológia	Pi 30.4.21	Po 3.5.21
215	Supis vád objektu Klinická onkológia, odstranenie vád	Pi 30.4.21	Št 13.5.21
216	Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 30.4.21	Št 13.5.21
217	IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Pi 14.5.21	Pi 14.5.21
218	Prevzatie objektu Klinická onkológia	Pi 14.5.21	Pi 14.5.21
219	**Blok F**	**Pi 7.5.21**	**Pi 22.10.21**
220	Kontrola dokumentácie dozorom	Pi 7.5.21	Št 20.5.21
221	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	Pi 10.9.21	Št 7.10.21
222	Práce v interiéri (chodby)	Pi 21.5.21	Št 7.10.21
223	Komplexné skúšky objektu F	Pi 8.10.21	Po 11.10.21
224	Supis vád objektu F, odstranenie vád	Pi 8.10.21	Št 21.10.21
225	Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Pi 8.10.21	Št 21.10.21
226	IČ – získanie dočasného užívacieho povolenia	Pi 22.10.21	Pi 22.10.21
227	Prevzatie objektu F	Pi 22.10.21	Pi 22.10.21
228	**Zdroj tepla**	**Str 1.7.20**	**Št 25.11.21**
229	Kontrola dokumentácie dozorom	Str 1.7.20	Ut 7.7.20
230	Realizácia prác	Str 8.7.20	Ut 5.10.21
231	Realizácia prepojov a baypassov	Št 19.8.21	Ut 7.9.21
232	Komplexné skúšky	Str 6.10.21	Ut 9.11.21
233	Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Str 10.11.21	Ut 23.11.21
234	IČ - Dočasné užívanie stavby	Str 24.11.21	Str 24.11.21
235	Prevzatie objektu do predčasného užívania	Št 25.11.21	Št 25.11.21
236	**Plynová prípojka a rozvody plynu**	**Str 1.7.20**	**Št 8.10.20**
237	Kontrola dokumentácie dozorom	Str 1.7.20	Ut 7.7.20
238	Geodetické práce	Str 8.7.20	Ut 15.9.20
239	Realizácia prác	Pi 10.7.20	Ut 15.9.20
240	Komplexné skúšky	Str 16.9.20	Ut 22.9.20
241	Podklady ku IČ pre získanie dočasného užívania stavby	Str 23.9.20	Ut 6.10.20
242	IČ - Dočasné užívanie stavby	Str 7.10.20	Str 7.10.20
243	Prevzatie objektu do predčasného užívania	Št 8.10.20	Št 8.10.20
244	Dokončovacie práce	Pi 14.7.23	Ut 25.7.23
245	Zariadenie staveniska - zrušenie	Pi 7.7.23	Št 13.7.23
246	Odovzdanie stavebného diela	Str 26.7.23	Str 26.7.23
